



INWESTYCJE

2015 - 2018



Opracowanie: Wydział Inwestycji Miejskich


PLAN PREZENTACJI

1. Wydatki inwestycyjne w latach 2015 – 2018
2. Źródła finansowania zadań inwestycyjnych
3. Wykaz inwestycji zrealizowanych w latach 2015–2018
4. Wykaz inwestycji będących w trakcie realizacji
5. Zadania inwestycyjne planowane

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2015 – 2018

1. Relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem Gminy
Miasto Świdnica
2. Porównanie wydatków inwestycyjnych
w latach 2015–2018
3. Wydatki inwestycyjne poniesione
w różnych kategoriach


Relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem Gminy Miasto Świdnica

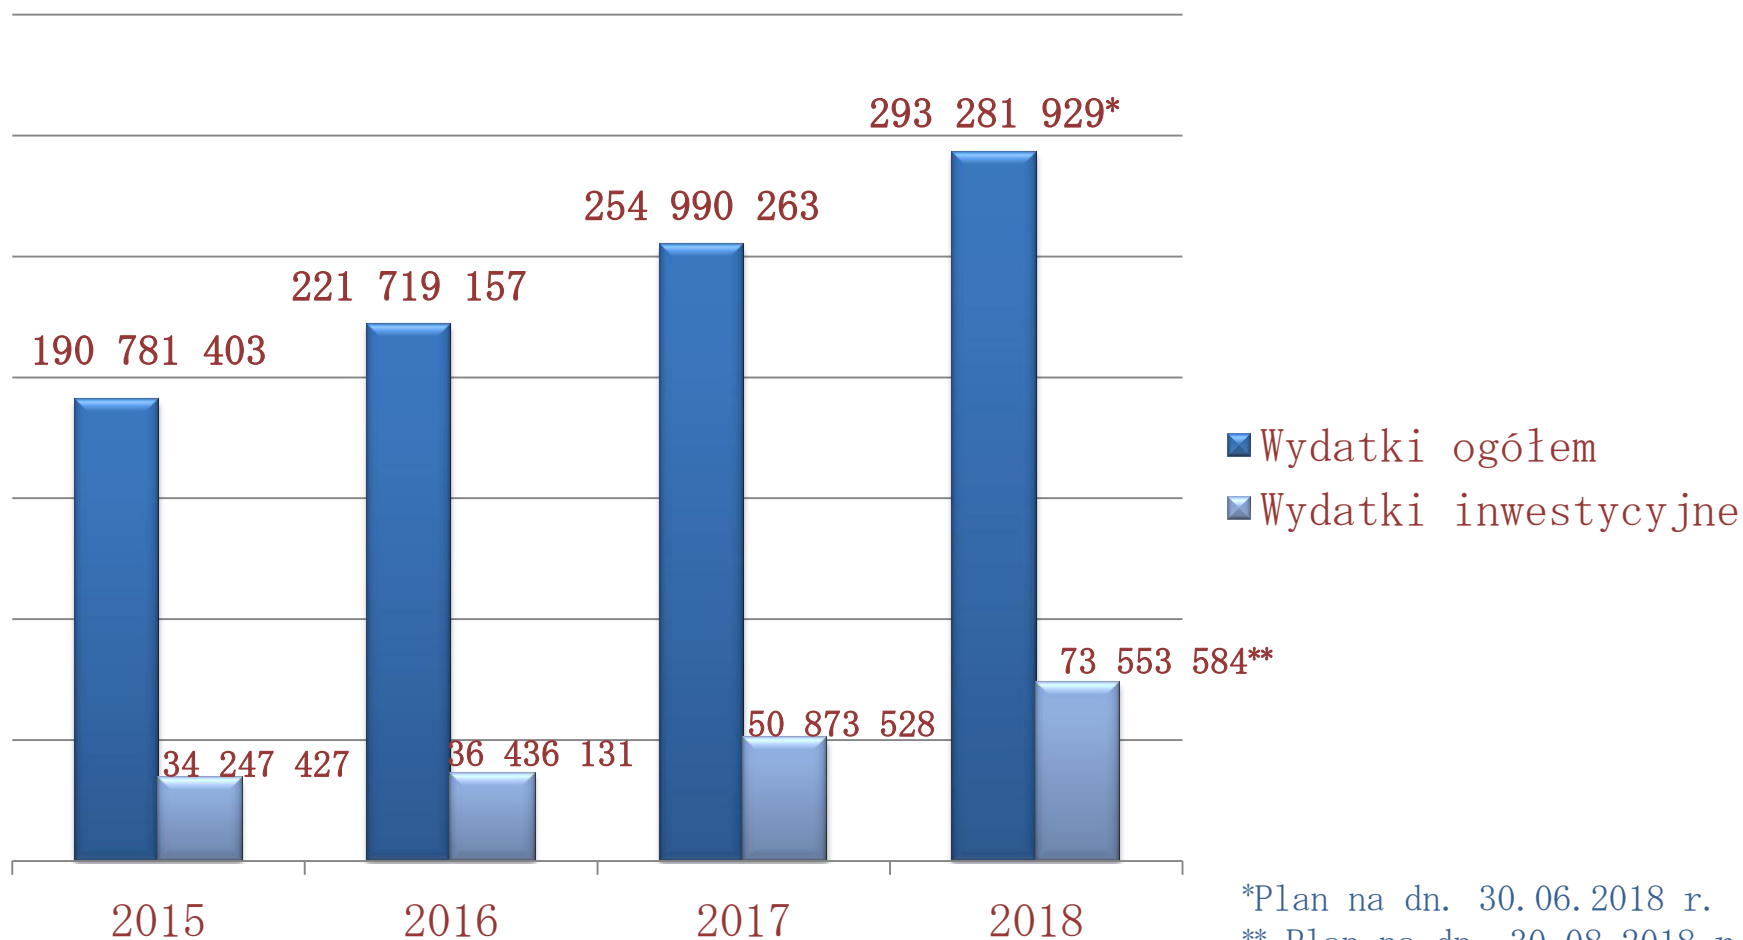


*Plan na dn. 30.06.2018 r.

** Plan na dn. 30.08.2018 r.

Porównanie wydatków inwestycyjnych w latach 2015–2018

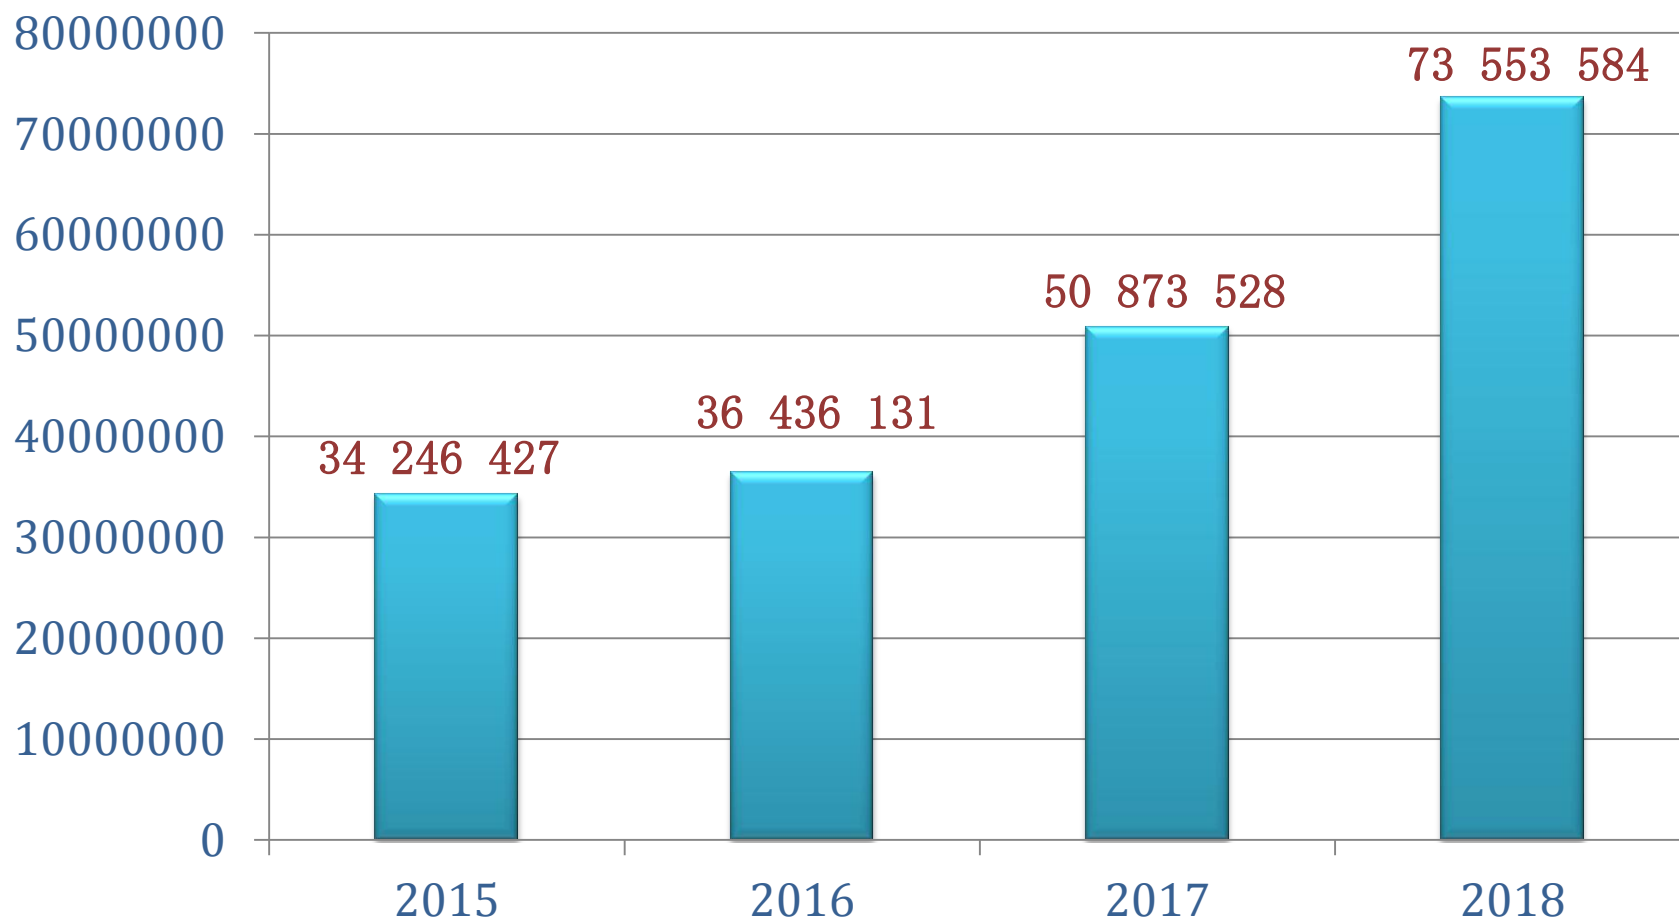


Wydatki inwestycyjne poniesione w różnych kategoriach

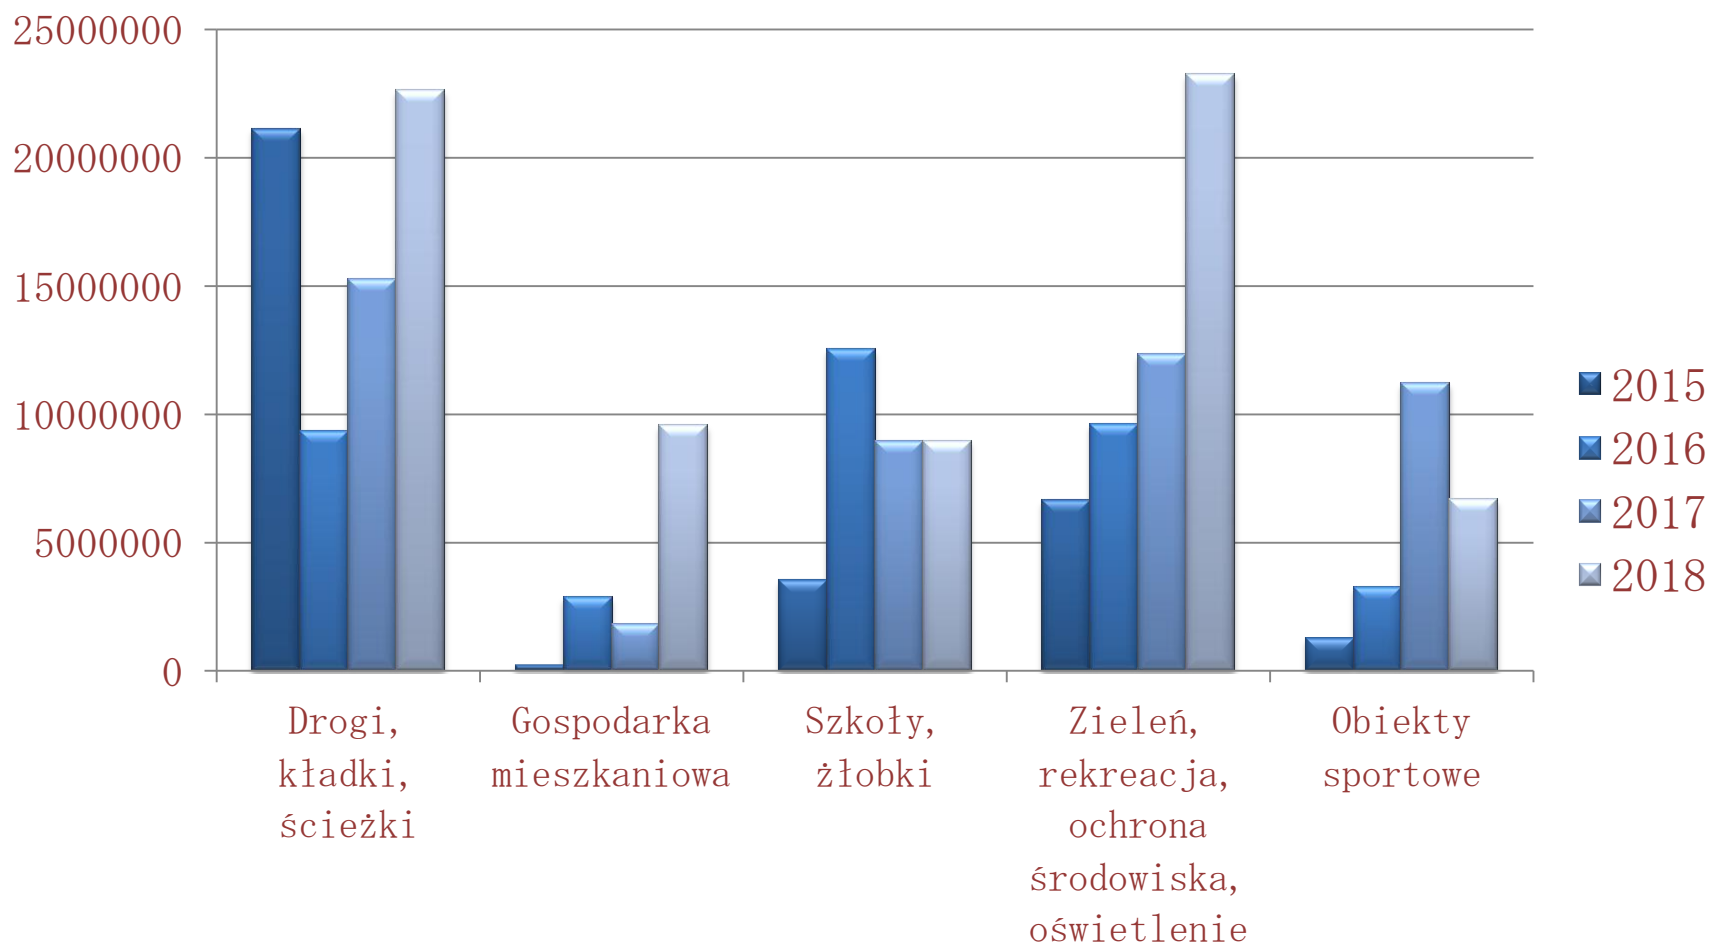


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Zadania zrealizowane z udziałem dofinansowania z UE
2. Bieżące zadania realizowane z udziałem dofinansowania z UE
3. Zestawienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych


Zadania zrealizowane z udziałem dofinansowania z UE

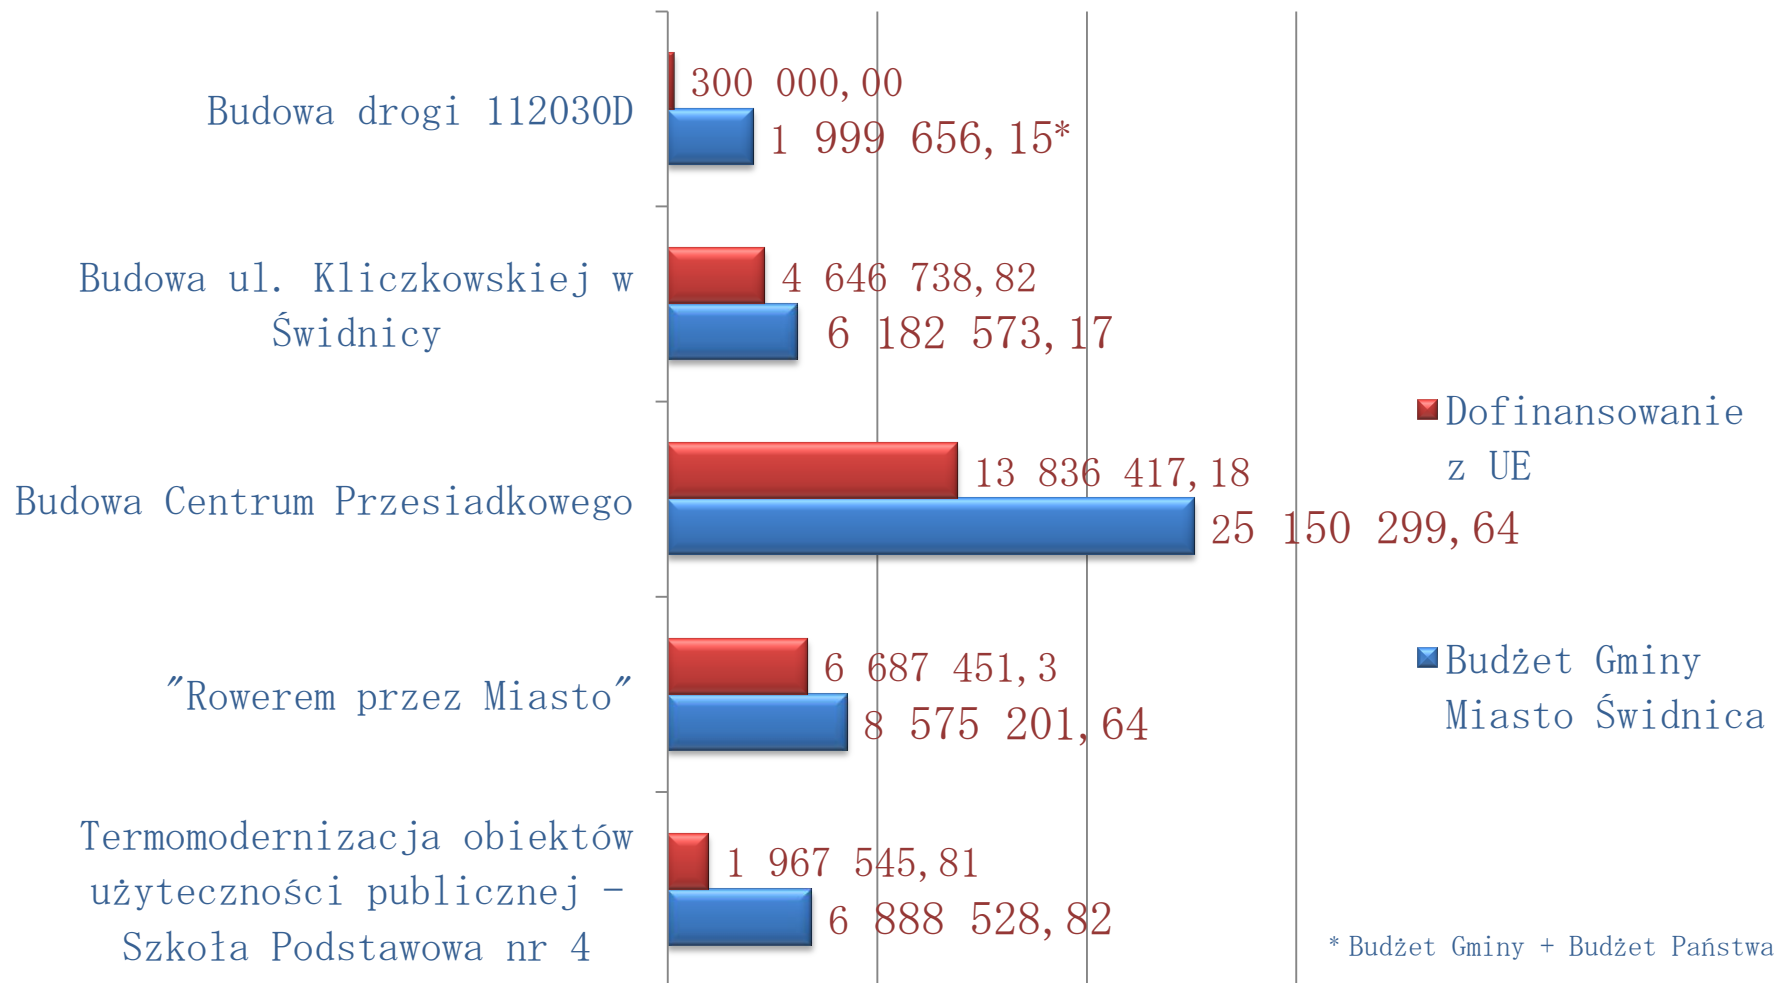

Bieżące zadania realizowane z udziałem dofinansowania z UE

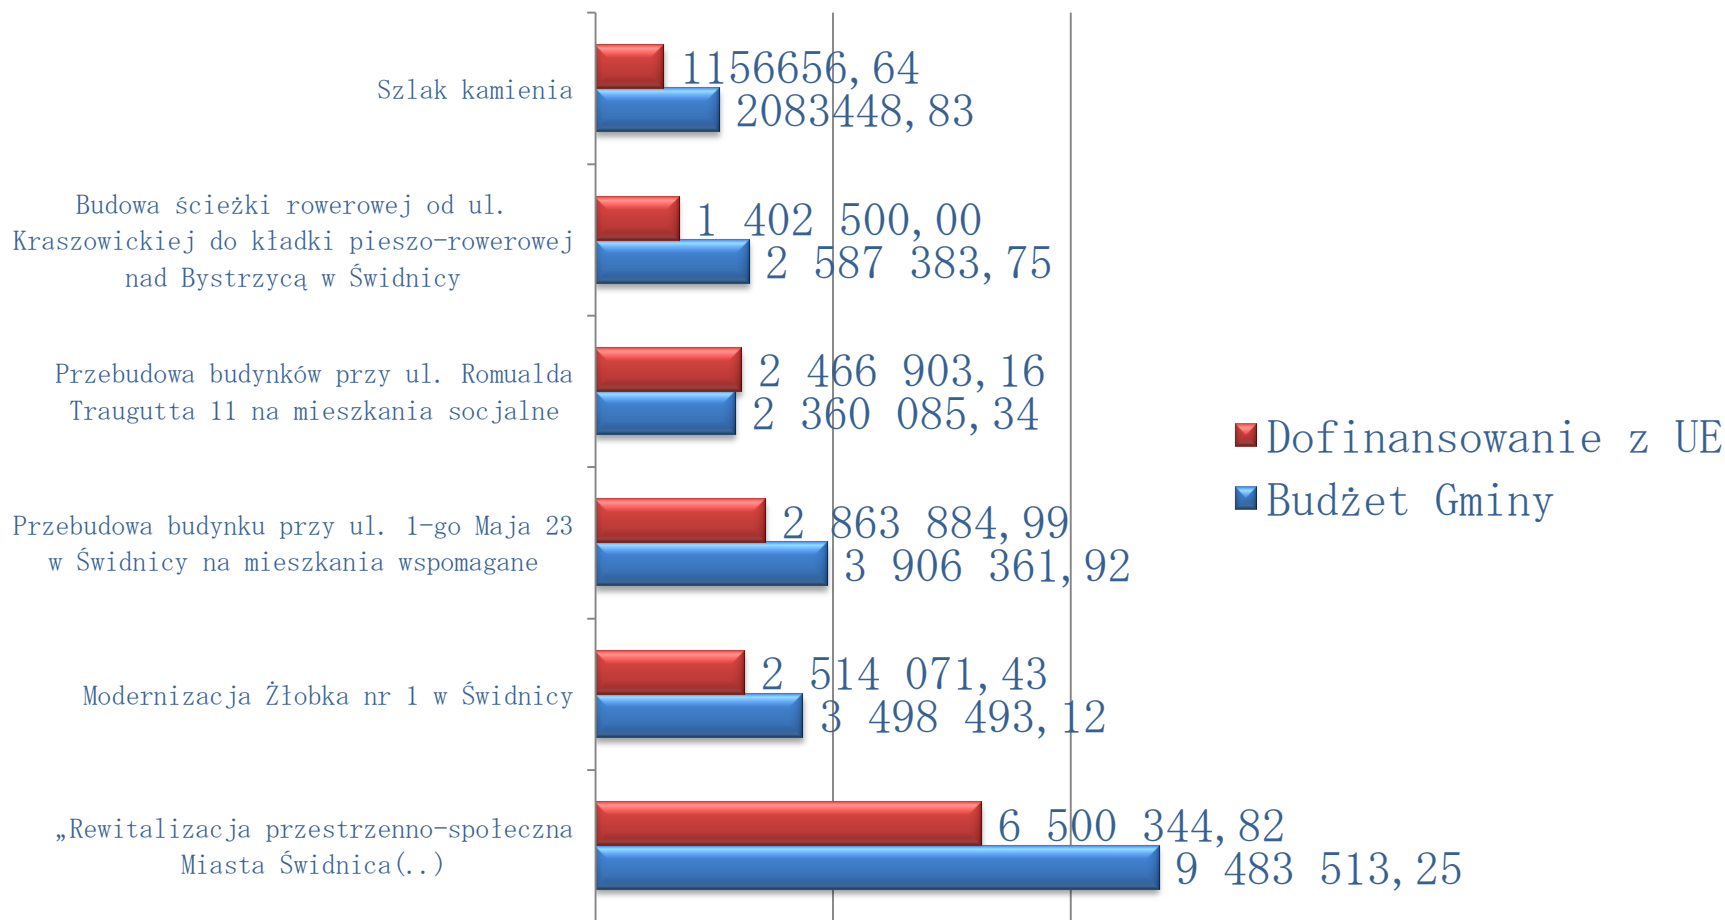

Zestawienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych

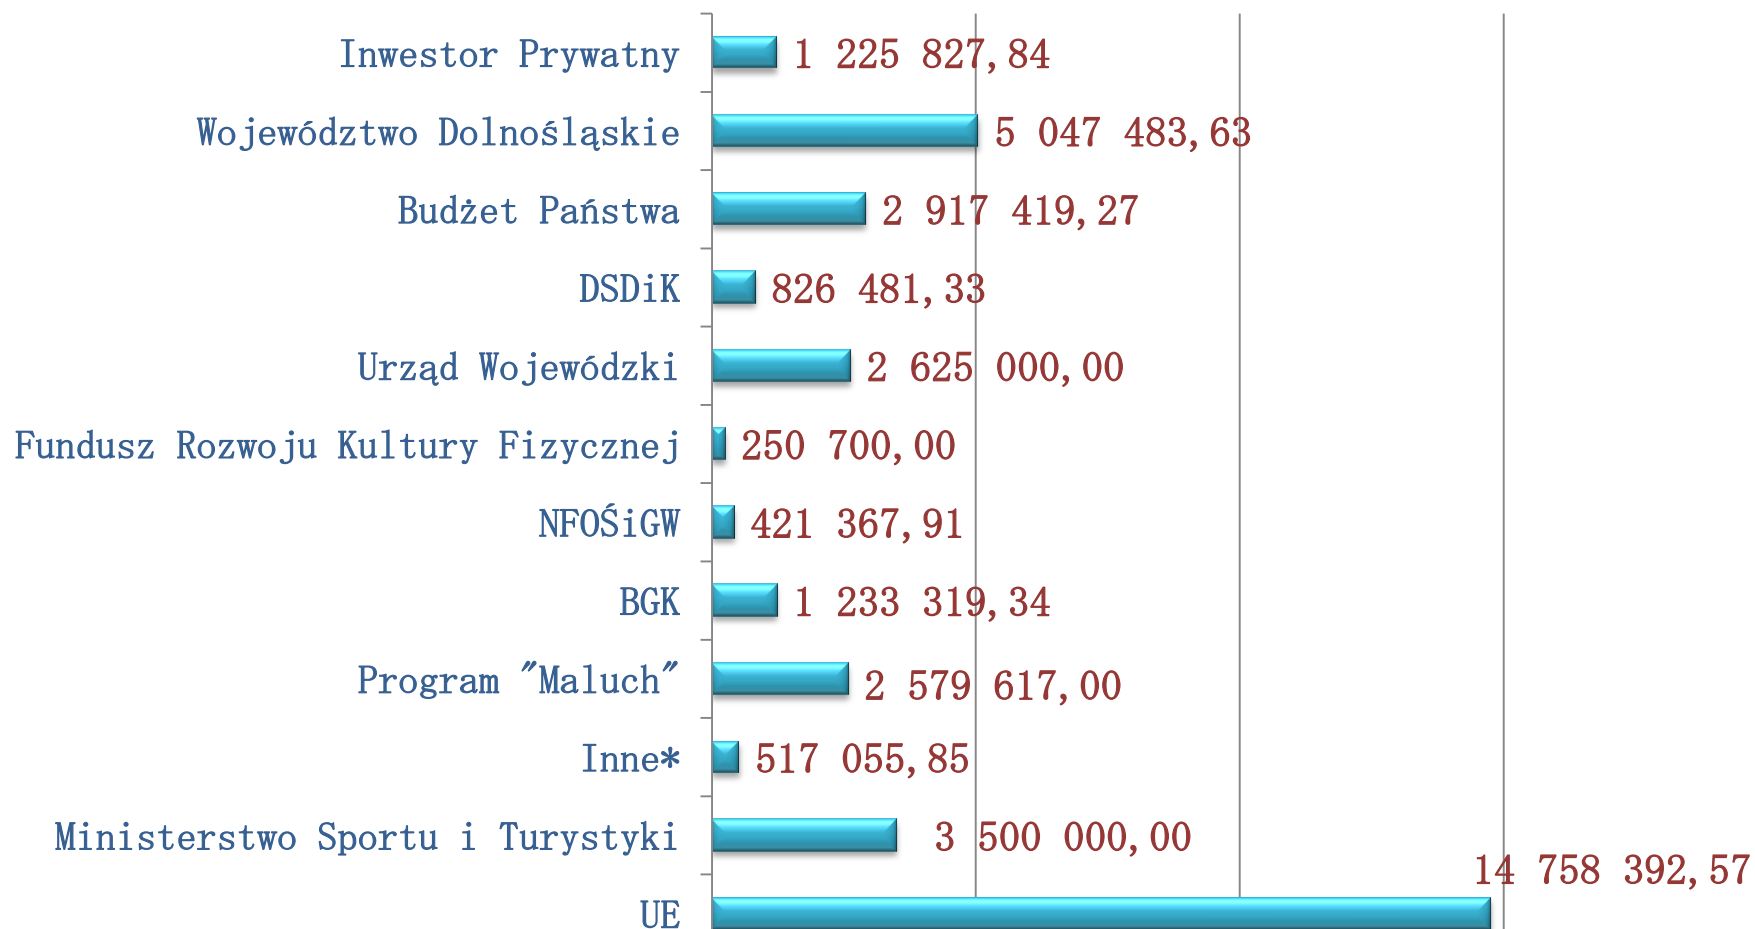

*Fundacja „Naszej Szkole” Świdnica, MZEC, ŚPWIK Sp. z o.o., Gmina Świdnica, TBS Sp. z o.o.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2015 – 2018, prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich oraz Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a

- **Wartość inwestycji:** 9 925 214,87 zł
- **Dofinansowanie:** 1 500 000,00 zł
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- **Termin realizacji:** 17.09.2015 r. - 31.08.2018 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:** konsorcjum
DABRO-BAU i BUD-ZIEM

Przed





Remont dachu w budynku Fundacji „Naszej Szkole” w ramach inicjatywy lokalnej

- **Wartość zadania:** 145 590,00 zł
- **Darowizna:** 93 920,00 zł
od Fundacji „Naszej Szkole” Świdnica
- **Termin realizacji:** 25.06.2018 r. – 28.08.2018 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:** MAT-BRUK
Jolanta Wilas-Matysiak

Budowa sięgacza przy ulicy Leśnej

- **Wartość inwestycji:** 1 058 139,89 zł
- **Termin realizacji:** 01.12.2017 r. – 29.06.2018 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Przed



Po



Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy

- **Wartość inwestycji:** 310 320,22 zł
- **Termin realizacji:** 01.2018 r. – 07.2018 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:** Dabro-Bau



Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47

- **Wartość inwestycji:** 151 900,00 zł
- **Termin realizacji:** 03.04.2018 r. – 15.06.2018 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Roboty Ogólnobudowlane Ryszard Strugała



Modernizacja pustostanów na lokalne mieszkalne i socjalne

ul. Równa 5/9, ul. Równa 5/13 oraz ul. Teatralna 25/3

- **Wartość inwestycji:** 230 094,72 zł

- **Dofinansowanie z BGK:**

ul. Równa – 62 461,47 zł

ul. Teatralna - 33 436,24 zł

- **Termin realizacji:**

ul. Równa – 16.02.2018 r. – 27.04.2018 r.

ul. Teatralna – 29.01.2018 r. – 11.05.2018 r.

- **Wykonawca robót budowlanych:**

Zakład Ogólnobudowlany Tadeusza Brońskiego – ul. Równa

Gałafin Roman Firma remontowo-budowlana – ul. Teatralna

Przed



Po



Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4

- **Wartość inwestycji:** 6 888 528,82 zł
- **Dofinansowanie z Unii:** 1 967 545,81 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
- **Termin realizacji:** 14.09.2015 r. – 25.01.2018 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
ROKOM” H.G.I. Komorowscy sp. j. Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych



Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy

- **Wartość inwestycji :** **5 204 833,21 zł**
- **Dofinansowanie:** **2 391 326,00 zł**
z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” – moduł 1 i 2 (Gminy)
- **Termin realizacji:** **28.06.2016 r. – 09.11.2017 r.**
- **Wykonawca robót budowlanych:**
KBUD Krzysztof Łuksza



Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej

Wartość inwestycji : 2 770 113,22 zł

Dofinansowanie: 1 233 319,34 zł

z Banku Gospodarstwa Krajowego

Termin realizacji: 02.06.2015 r. – 17.08.2017 r.

Wykonawca robót budowlanych:


MTM Budownictwo



Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza objektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy

- **Wartość inwestycji :** **5 105 231,00 zł**
- **Dofinansowanie:** **2 000 000,00 zł**
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- **Termin realizacji:** **08.09.2016 r. – 30.06.2017 r.**
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Broński

INWESTOR NA MEDAL 2017
MODERNIZACJA ROKU 2017

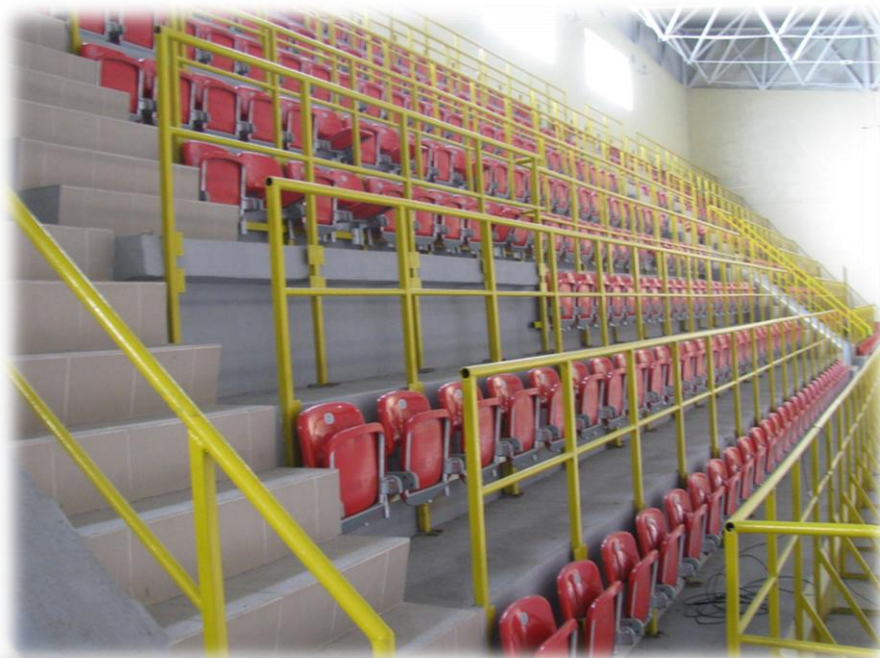

Przed

Po



Przebudowa ul. Siennej

- Wartość inwestycji : 462 473,36 zł
- Termin realizacji: 09.03.2017 r. – 30.06.2017 r.
- Wykonawca robót budowlanych:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów



Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy

- **Wartość inwestycji:** **256 309,37 zł**
- **Termin realizacji:** **22.12.2016 r. – 07.06.2017 r.**
- **Wykonawca robót budowlanych:**
TELFA Wacław Kruk

Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

- Wartość inwestycji: **1 187 102,31 zł**
- Termin realizacji: **09.02.2017 r. – 02.06.2017 r.**
- Wykonawca robót budowlanych: **DABRO-BAU**



Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej

- **Wartość zadania:** 8 575 201,64 zł

- **Dofinansowanie:** 6 687 451,30 zł

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

- **Termin realizacji:** 01.2016 r. – 12.2017 r.

- **Wykonawca robót budowlanych:**

ŚPBDiM Sp. z o.o. MOST Sp. z o.o., ZRT TELFA





Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu
Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii
Krajowej 47-49

Wartość inwestycji: **1 937 070,52 zł**

Termin realizacji: **18.10.2015 r. – 12.12.2016 r.**

Wykonawca robót budowlanych: **Clima Heat s.j.**

Budowa Schroniska dla zwierząt

Wartość inwestycji: **1 947 861,14 zł**

Termin realizacji: **02.07.2015 r. – 09.12.2016 r.**

Wykonawca robót budowlanych:

Zakład Ogólnobudowlany Tadeusza Brońskiego



Zagospodarowanie zalewu Witoszówka
z budową przystani i organizacją wypożyczalni
sprzętu pływackiego

Wartość inwestycji: **987 476,87 zł**

Termin realizacji: **30.09.2015 r. – 02.12.2016 r.**

Wykonawca robót budowlanych: **REJJS**



Zagospodarowanie skweru na placu 1000-lecia PP

Wartość inwestycji: 1 065 546,25 zł

Dofinansowanie: 421 367,91 zł

z NFOŚiGW „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy

Termin realizacji: 02.07.2014 r. – 07.07.2016 r.

Wykonawca robót budowlanych: **PARK – M**

MODERNIZACJA ROKU 2016

Przed



Po



Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej etap I

- **Wartość inwestycji:** 769 242,00 zł
- **Termin realizacji:** 11.03.2016 r. – 23.05.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
FIRMA GUTKOWSKI

Przebudowa budynku Klubu Bolko
w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów
bezpieczeństwa pożarowego

- **Wartość inwestycji:** 460 413,15 zł
- **Termin realizacji:** 30.12.2015 r. – 05.05.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Krzysztofa Zająca
z Walimia**



bolko

LEVEL

APTEKA

WELGUS

Boisko wielofunkcyjne wraz
z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole
Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy

• **Wartość inwestycji:** **739 091,58 zł**

• **Dofinansowanie:** **250 700,00 zł**

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

• **Termin realizacji:** **21.08.2015 r. – 30.04.2016 r.**

• **Wykonawca robót budowlanych:**

DABRO-BAU

INWESTOR NA MEDAL 2017



Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap I

- **Wartość inwestycji:** **1 352 358,13 zł**
- **Termin realizacji:** **22.03.2012 r. – 31.03.2016 r.**
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o.

Modernizacja mostu w parku Centralnym

- Wartość inwestycji: **373 680,19 zł**
- Termin realizacji: **02.10.2014 r. – 29.10.2015 r.**
- Wykonawca robót budowlanych: **TAUMER**



Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świdnicy
w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminę Miasto
Świdnica

• **Wartość inwestycji:** 500 355,00 zł

• **Dofinansowanie:** 188 291,00 zł

Z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch” – edycja 2015

• **Termin realizacji:** 23.04.2015 r. – 21.10.2015 r.

• **Wykonawca robót budowlanych:**

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bielawy



Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I

- **Wartość inwestycji:** 2 800 237,34 zł
- **Termin realizacji:** 04.2014 r. – 17.09.2015 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Krzysztofa Zająca z
Walimia**

Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4
i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie
dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego

Wartość inwestycji: 285 025,64 zł

○ Przedszkole Miejskie nr 4: 187 636,19 zł

○ Przedszkole Miejskie nr 14: 97 389,45 zł

Termin realizacji: 03.06.2015 r. – 14.09.2015 r.

Wykonawca robót budowlanych:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bielawy



OR AUTORYZOWANY

lant
Saunier Duval

MARKO
602 637 845

MIESZKANIE
MIESZKANIE

Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy

- **Wartość inwestycji:** 25 150 299,64 zł
- **Dofinansowanie:** 13 836 417,18 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
- **Termin realizacji:** 10.2010 r. – 12.08.2015 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**

SKANSKA S.A.



Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Ofiar Oświęcimskich

- **Wartość inwestycji:** 127 920,00 zł
- **Termin realizacji:** 12.02.2018 r. – 31.05.2018 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
DROG-ZIEM Zbigniew Wysoczański

Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy

- **Wartość inwestycji:** 367 110,56 zł
- **Termin realizacji:** 06.11.2017 r. – 15.12.2017 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
DROG-ZIEM Zbigniew Wysoczański



Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnica

- **Wartość inwestycji:** **138 168,51 zł**
- **Termin realizacji:** **06.02.2018 r. – 07.05.2018 r.**
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych W&J
Maria Chorzemska, Wiesław Chorzemski



Budowa parkingu przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – Etap I

- **Wartość inwestycji:** 76 260,00 zł
- **Termin realizacji:** 11.12.2017 r. – 31.08.2018 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
DROG-ZIEM Zbigniew Wysoczański

Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej

- **Wartość inwestycji:** 228 780,00 zł
- **Dofinansowanie:** 187 452,00 zł

z MZEC

- **Termin realizacji:** 04.08.2017 r. – 27.03.2018 r.

- **Wykonawca robót budowlanych:**

PONTAR Paweł Rokicki



Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana
Łukasińskiego w Świdnicy (przebudowa chodnika
pomiędzy ul. Kanonierską i ks. Bolka Świdnickiego)

- **Wartość inwestycji: 162 717,93 zł**
- **Termin realizacji: 04.01.2018 r. – 31.05.2018 r.**
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.



MĘSKA I DAMSKA
XXXXL

Y PON DT...
MĘSKA I DAMSKA

1945

Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów

- **Wartość inwestycji: 5 141,40 zł**
- **Termin realizacji: 30.10.2017 r. – 27.12.2017 r.**
- **Wykonawca: IBOMBO Janusz Kubasik**



Przebudowa ul. Deszczowej

- **Wartość inwestycji:** 361 951,61 zł
- **Termin realizacji:** 29.12.2017 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
DROG-ZIEM Zbigniew Wysoczański



Przebudowa ul. Letniej

- **Wartość inwestycji:** 157 075,92 zł
- **Termin realizacji:** 23.11.2015 r. – 16.05.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:** MAR-BRUK
Jolanta Wilas-Matysiak



Przebudowa ul. Komunardów

- **Wartość inwestycji:** 251 150,49 zł
- **Dofinansowanie:** 75 000,00 zł
z Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- **Termin realizacji:** 10.12.2015 r. – 15.06.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.



Przebudowa ulicy Podmiejskiej

- **Wartość inwestycji:** 64 138,36 zł
- **Termin realizacji:** 20.07.2015 r. – 10.08.2015 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Budroad – Świdnica Dariusz Wrona

Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy

Etap I:

- Budowa chodnika dla pieszych i drogi dla rowerów,
- nasyp w sąsiedztwie rzeki,
- 40 miejsc postojowych,
- oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa,
- przebudowa kolidujących sieci,
- zjazdy na posesje.

Etap II:

- przebudowa istniejącej ulicy na odcinku od Wincentego Witosa do ul. Mikołaja Kopernika,
- przebudowa skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Mikołaja Kopernika,
- wykonanie 70 miejsc postojowych,
- oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa,
- ścieżka rowerową.
- przebudowa kolidującej sieci energetycznej.

Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy

- Wartość inwestycji etap I: 3 682 008,65 zł
 - Wartość inwestycji etap II: 2 500 564,52 zł

 - Dofinansowanie etap I: 2 771 209,10 zł
 - Dofinansowanie etap II: 1 875 529,72 zł
- z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Termin zakończenia realizacji: 14.11.2014 r. - 26.06.2015 r.
 - Wykonawca robót budowlanych: **BUDOSTAL-8**




Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (drogi wojewódzkiej nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda

- **Wartość inwestycji:** 4 154 693,87 zł
- **Dofinansowanie :** 2 625 000,00 zł
z Urzędu Wojewódzkiego
- **Termin realizacji:** 20.08.2015 r. - 28.01.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
- **Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów**



Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego

- **Wartość inwestycji:** 1 001 688,67 zł
- **Dofinansowanie :** 826 481,33 zł
z DSDiK (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei)
- **Termin realizacji:** 15.06.2015 r. - 14.02.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:** SKANSKA S.A.



Rozbudowa ul. Śląskiej – parking

- **Wartość inwestycji:** 249 260,73 zł
- **Termin realizacji:** 17.12.2015 r. - 31.03.2016 r.

Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy – ul. Ceglana

- **Wartość inwestycji:** 247 510,64 zł
- **Termin realizacji:** 30.12.2015 r. - 11.04.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy

- **Wartość inwestycji:** 1 853 254,82 zł
- **Dofinansowanie:** 837 578,00 zł
 - z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 707 578,00 zł
 - oraz dotacji z Gminy Świdnica - 130 000,00 zł
- **Termin realizacji:** 04.05.2016 r. - 17.08.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:** SKANSKA S.A.



Przebudowa ul. Spółdzielczej w Świdnicy

- **Wartość inwestycji:** 443 612,35 zł
- **Dofinansowane:** 30 683,85 zł
z TBS Sp. z o.o.
- **Termin realizacji:** 28.06.2016 r. - 30.09.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Jerzy Majorek P.P.U.H Steinbudex - J.M.



Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej w Świdnicy

- **Wartość inwestycji:** 165 600,50 zł
- **Termin realizacji:** 01.08.2016 r. - 30.11.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAŃCZYK" Spółka
Jawna

Przebudowa drogi woj. Nr 379 – od
skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do
ul. Mierniczej w m. Świdnica

- **Wartość inwestycji:** 839 314,89 zł
- **Dofinansowanie:** 419 657,45 zł
z budżetu województwa dolnośląskiego
- **Termin realizacji:** 29.08.2016 r. - 30.11.2016 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. Świdnica

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie
przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy
w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej

- **Wartość inwestycji:** 280 455,01 zł
- **Dofinansowanie:** 140 227,51 zł
z budżetu województwa dolnośląskiego
- **Termin realizacji:** 30.11.2016 r. - 06.04.2017 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” Sp. j.
Świebodzice

Przebudowa drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 2

- **Wartość inwestycji:** 147 588,09 zł
- **Termin rozpoczęcia:** 30.12.2016 r. - 28.04.2017 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. Świdnica

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379
w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-
rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej

- **Wartość inwestycji:** 431 814,44 zł
- **Dofinansowanie:** 215 907,22 zł
z budżetu województwa dolnośląskiego
- **Termin realizacji:** 30.11.2016 r. - 30.04.2017 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” Sp. j.
Świebodzice



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382
w Świdnicy w rejonie skrzyżowania ulic
Przemysłowej i Kopernika

- Wartość inwestycji: **767 026,87 zł**
- Dofinansowanie: **702 341,98 zł**
z budżetu województwa dolnośląskiego
- Termin realizacji: **13.09.2016 r. - 30.04.2017 r.**
- Wykonawca robót budowlanych: **SKANSKA S.A.**
Wrocław



Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica

- **Wartość inwestycji:** 481 146,51 zł
- **Termin realizacji:** 11.08.2015 r. - 31.05.2017 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
 - STAŃCZYK Sp. j. Świebodzice;
 - Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.;
 - Budroad-Świdnica Dariusz Wrona

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382
w Świdnicy w rejonie skrzyżowania ulic
Przemysłowej i Kopernika

- Zadanie obejmuje budowę zatok przy ulicach:
 - ul. H. Brodatego
 - ul. Kilińskiego
 - ul. Langiewicza
 - ul. Odnowiciela
 - ul. Prądyńskiego .

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

- **Wartość inwestycji:** 1 950 170,73 zł
- **Termin realizacji:** 26.06.2015 r. - 31.05.2017 r.

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Wykaz chodników objętych zadaniem:

- Ul. H. Brodatego,
- Ul. Ofiar Oświęcimskich, - dojście do SP2
- Ul. T. Kościuszki,
- Os. Zawiszów,
- Ul. Kanonierska,
- Ul. Wrocławska,
- Ul. Wileńska,
- Ul. Świętojańska,
- Ul. M. Skłodowskiej – Curie,
- Ul. Zamenhofa,
- Os. Zwierzynieckie,
- Ul. Prądyńskiego,
- Ul. Świerkowa,
- Ul. Krakowska,
- Ul. Dąbrowskiego,
- Ul. Parkowa,
- Ul. Armii Krajowej,
- Ul. Reja,
- Ul. Saperów,
- Ul. Waryńskiego,
- Ul. Marcinkowskiego,
- Ul. Wróblewskiego,
- Ul. Mazowiecka,
- Ul. Wyszyńskiego,
- Ul. Słowiańska,
- Ul. Rycerska,
- Pl. Wojska Polskiego,
- Ul. Jagiellońska.

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Wykaz chodników objętych zadaniem:

- Ul. Emilii Plater,
- Ul. Kozara-Słobódzkiego,
- Ul. J. Bema,
- Ul. M. Kopernika,
- Ul. J. Piłsudskiego,
- Sięgacz ul. M. Kozara-Słobódzkiego,
- Ul. J. Długosza,
- Ul. H. Pobożnego,
- Ul. Biberaska,
- Ul. Gdyńska,
- Ul. Wierzbowa,
- Ul. Lwowska,
- Ul. Jodłowa.



ul. Biberaska



ul. Wierzbowa

Przebudowa drogi wojewódzkiej od ul. Mickiewicza do ul. Leśnej

- **Wartość inwestycji:** 283 537,34 zł
- **Dofinansowanie:** 141 768,67 zł
z budżetu Państwa
- **Termin realizacji:** 08.07.2015 r. - 07.10.2015 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o.



Przebudowa ul. Legii Nadwiślańskiej

- **Wartość inwestycji:** 107 453,53 zł
- **Termin realizacji:** 24.08.2015 r. – 12.10.2015 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAŃCZYK” Spółka
Jawna**

Przebudowa ul. Rolniczej

- **Wartość inwestycji:** 147 612,30 zł

- **Dofinansowanie:** 118 827,84 zł

Prywatny inwestor PoloMarket

- **Termin rozpoczęcia:** 19.10.2015 r. - 01.12.2015 r.

- **Wykonawca robót budowlanych:**

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAŃCZYK” Spółka
Jawna**



Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa – Etap II

- **Wartość inwestycji:** 1 042 722,03 zł
- **Termin realizacji:** 21.08.2015 r. – 18.12.2015 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
**Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o.**



Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II

- **Etap I** – Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy obejmujący ulicę Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic bocznych, pętlę autobusową oraz przebudowę przepustu nad potokiem Jabłoniec – teren Gminy Miasto Świdnica
- **Etap II** – Przebudowa drogi gminnej nr 112030D obejmujący teren Gminy Świdnica – wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nad Potokiem

Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II

- **Wartość inwestycji:** 4 367 728,75 zł
- **Dofinansowanie:** 2 701 690,16 zł
 - z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 2 068 072,60 zł
 - Dotacja celowa: 300 000,00 zł
 - Środki finansowe wynikające z porozumienia międzygminnego: 333 617,56 zł
- **Termin rozpoczęcia:** 19.05.2015 r. - 12.2015 r.
- **Wykonawca robót budowlanych:**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz firma EUROVIA



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI Ciepłej w Świdnicy Sp. z o.o.
Świdnica ul. Pogodna 1
**NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE
SYSTEMY GRZEWcze**
www.energetyka-swidnica.pl
074 852 40 41; 074 852 25 77; fax 074 042 43 58

SERWIS
KLIMATYZACJI
WEZE CIŚNIENIOWE

CHŁODNICE
ELGI
TANIE
MONTAŻ

Na odcinku
800m

Przebudowa ul. Szczęśliwej

- **Wartość inwestycji:** **102 249,90 zł**
- **Termin realizacji:** **23.11.2015 r. – 16.05.2015 r.**
- **Wykonawca robót budowlanych:**
- **MAT-BRUK Jolanta Wilas-Matysiak**



Cmentarze – 206 545,65 zł

- Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego
- **Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach zadania Budowa Platformy Cyfrowej w mieście Świdnica - stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi**

Oświetlenie – 1 283 839,78 zł

- **Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla**
- **Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki**
- **Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski**

Oświetlenie

- Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych (ul. Zamenhofa, ul. Sikorskiego, ul. Westerplatte)
- Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim
- Przebudowa oświetlenia terenu garaży przy ul. Zwierzynieckiej
- Budowa oświetlenia ul. Czereśniowa
- Przebudowa oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina

Oświetlenie

- **Przebudowa oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza**
- **Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej w Świdnicy (na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Westerplatte)**
- **Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce**
- **Przebudowa oświetlenia w parku Kanonierów**
- **Budowa oświetlenia ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego**
- **Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Kazimierza Wielkiego/al. Colgate/T. Ząbka**
- **Budowa oświetlenia alejki w Parku Zawiszowskim przy ul. Łukasińskiego**

Obiekty rekreacyjne – 1 715 945,20 zł

- Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na placu Wojska Polskiego
- Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego
- Budowa placu zabaw w centrum tzw. „Plastra Miodu”
- Budowa placów zabaw na terenie miasta Świdnicy:
 - w pobliżu szkoły podstawowej „Blżej dziecka” przy ul. Jagiellońskiej,
 - na terenie zieleni w pobliżu komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kopernika 3,
 - na skwerze przy ul. Kraszowickiej.



Obiekty rekreacyjne

- Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Przemysłową , a Mazowiecką w Świdnicy
- Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy – Park Kanonierów i Park Ułanów
- Rewitalizacja skweru przy ul. Michała Drzymały w Świdnicy
- Budowa alejek w parkach miejskich – wykonanie alejki w parku Zawiszowskim na ul. Łukasińskiego





Instalacje sanitarne – 316 153,74 zł

- **Przebudowa Szaletu przy ul. Św. Małgorzaty**
- **Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej**
- **Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy**

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

Wykaz bieżących inwestycji prowadzonych przez Wydział
Inwestycji Miejskich oraz Wydział Dróg i Infrastruktury
Miejskiej

Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica –
przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni
wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową
i wyposażeniem budynku Rynek 39-40

Koszt całego zadania szacowany jest na kwotę **9 483 517,25 zł.**

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 -2020 na kwotę **6 500 344,82 zł.**

Termin zakończenia całości zadania: **30.06.2019 r.**

Przebudowę ul. Siostrzanej oraz kwartału Rynek – ul. Siostrzana wykonuje firma
Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. natomiast przebudową budynku Rynek 39-40
firma **Sirbut - Minari S.A.**



Rynek 39 - 40

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy

Koszt robót budowlanych szacowany jest na kwotę 5 547 009,56 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na kwotę 3 076 083,00 zł.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.05.2019 r.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma STA-DAR Dariusz Stańczyk.



ROTOMAT
POMOCNÁ PRÁCE
PRÍPRAVA A ZASTAVENIE
VŠETKÝCH TYPŮ
VYKONÁVANIE
VŠETKÝCH TYPŮ
VYKONÁVANIE
VŠETKÝCH TYPŮ

Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 3 498 493,12 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na kwotę **2 514 071,43 zł.**

Termin zakończenia planowany jest na 16.11.2018 r.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło.



Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane

Wartość robót budowlanych szacowany jest na kwotę 3 906 361,92 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 na kwotę **2 863 884,99 zł**.

Termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na 30.10.2018 r.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma **SIRBUD – MINARI S.A.**



Budowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 2 360 085,34 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na kwotę 2 466 903,16 zł.

Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 19.01.2019 r.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło.

"Szlak kamienia" – Rewitalizacja czterech fontann

Wartość robót budowlanych szacowana jest na kwotę 2 083 448,83 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 30.01.2019 r.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska na kwotę **268 260,00 euro**.

Wykonawcą robót budowlanych są firmy Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Waclaw Kruk oraz RENOVATORIUM Konserwacja Obiektów Zabytkowych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima 1 – Etap II

Inwestycja obejmuje rozbudowę szkoły o dodatkowe skrzydło od strony zachodniej, powstaną nowe dojazdy a także nowy plac manewrowy na potrzeby stołówki.

Termin zakończenia robót planowany jest na 16.11.2018 r.

Wartość robót budowlanych szacowana jest na kwotę 3 699 999,90 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Ogólnobudowlany Tadeusza Brońskiego.



Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej

Zadanie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę **10 683 000,00 zł.**

Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 30.10.2018 r.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 19 887 533,59 zł.

Programem KAWKA zostało objętych **98 budynków** w Świdnicy.

Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej

Budynki objęte inwestycją znajdują się przy ulicach:

- Siennej,
- Wrocławskiej,
- Parkowej,
- Saperów,
- Kościelnej,
- Wodnej,
- Dębowej,
- Jodłowej,
- Kołłątaja,
- Sikorskiego,
- Słowackiego,
- Ofiar Oświęcimskich,
- Siostrzanej,
- Franciszkańskiej,
- Grodzkiej,
- Rynek,
- Pułaskiego,
- Teatralnej,
- Niecałej,
- Św. Agnieszki,
- Św. Małgorzaty,
- Łukasińskiego,
- 1-go Maja,
- Przechodniej

Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy

Zadanie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 5 891 466,81 zł.

Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 31.10.2018 r.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 18 709 643,00 zł.



Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy

Zadanie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2 286 154,00 zł.

Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 31.10.2018 r.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 5 832 573,00 zł.



Budowa parkingu przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 95 140,50 zł.

Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 13.09.2019 r.

Wykonawca robót budowlanych jest Zakład Robót Drogowych i
Ogólnobudowlanych W&J Maria Chorzemska, Wiesław Chorzemski

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku
pomiędzy skrzyżowaniami z ul. R. Traugutta
i Al. Niepodległości

Wartość zadania szacowana jest na kwotę **1 720460,89 zł**

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego na
kwotę 844 855,45 zł

Termin zakończenia zadania planowany jest na 20.11.2018 r.

Wykonawcą robót budowlanych jest Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 6 136 860,00 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego na kwotę
2 724 494,02 zł

Termin zakończenia zadania planowany jest na 20.11.2018 r.

Wykonawcą robót budowlanych jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o.

DROG-ZIEM Zbigniew Wysoczański

Przebudowa ul. Józefa Sowińskiego w Świdnicy

Wartość zadania szacowana jest na kwotę **989 687,52 zł**

Termin zakończenia zadania planowany jest na **05.01.2019 r.**

Wykonawca robót budowlanych jest **MAT-BRUK Jolanta Wilas-Matysiak**

Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy

Wartość zadania szacowana jest na kwotę **467 319,19 zł.**

Termin zakończenia zadania planowany jest na **10.12.2018 r.**

Wykonawcą robót budowlanych jest **Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o.**

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 2 587 383,75 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na kwotę 1 402 500,00 zł.

Termin zakończenia zadania planowany jest na 10.12.2018 r.

Wykonawca robót budowlanych jest Zakład Budownictwa Komunikacyjnego
„PAJTOR” Rafał Świło

Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 4 037 450,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie przez Prywatnego Inwestora na kwotę
1 107 000,00 zł.

Termin zakończenia zadania planowany jest na 15.06.2019 r.

Wykonawca robót budowlanych jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Dróg i
Mostów Sp. z o.o.

Przebudowa ul. Józefa Sowińskiego w Świdnicy

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 989 687,52 zł

Termin zakończenia zadania planowany jest na 05.01.2019 r.

Wykonawca robót budowlanych jest MAT-BRUK Jolanta Wilas-
Matysiak

Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 467 319,19 zł.

Termin zakończenia zadania planowany jest na **10.12.2018 r.**

Wykonawca robót budowlanych jest Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

PLANOWANE ZADANIA

Wykaz inwestycji będących na etapie projektowania

Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68 – dokumentacja techniczna

- **Wartość projektu:** 72 570,00 zł
- **Termin realizacji:** 17.07.2018 r. - 18.10.2018 r.
- **Projektant:** Autorskie Biuro Projektów „a” S.C.
Witold Baran

Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej – dokumentacja techniczna

- **Wartość projektu:** 86 100,00 zł
- **Termin realizacji:** 12.04.2018 r. – 30.06. 2018 r.
- **Projektant:** „Invent” Pracownia Projektowo Wykonawcza mgr inż. Jacek Krawczyński

Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** 23 985,00 zł
- **Termin realizacji:** 07.09.2017 r. – 15.03.2018 r.
- **Projektant:**
Usługi projektowe mgr inż. Robert Szczepanek

Przebudowa budynku przy
ul. Spółdzielczej 29-30 – dokumentacja
techniczna

- **Wartość projektu:** 68 880,00 zł
- **Termin realizacji:** 15.06.2018 r. – 01.10.2018 r.
- **Projektant:** Biuro Architektoniczne Cignus
Świdnica

Przebudowa instalacji technologii
uzdatniania wody na basenie krytym przy
Szkołe Podstawowej nr 4 w Świdnicy

Szacowana wartość zadania wynosi 360 000,00 zł.

Zakończenie zadania planowane jest na koniec 2018 roku.

Przebudowa placów zabaw z wymiana urządzeń i nawierzchni

Szacowana wartość zadania wynosi 450 000 zł.

Termin zakończenia zadania planowany jest na początek 2019 roku.

Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzyca w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** 35 670,00 zł
- **Termin realizacji:** 30.11.2017 r. – 15.05.2018 r.
- **Projektant:** PONTAR Paweł Rokicki

Budowa parkingu przy ul. Słowackiego w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** **24 000,00 zł**
- **Termin realizacji:** **07.06.2017 r. – 30.11.2017 r.**
- **Projektant:**
**„VIA ROMANA” drogi, projektowanie, nadzory Roman
Konieczny**

Rozbudowa ul. Gdyńskiej w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** 6 160,00 zł
- **Termin realizacji:** 30.06.2017 r. – 15.03.2018 r.
- **Projektant:**
„VIA ROMANA” drogi, projektowanie, nadzorowanie
Roman Konieczny

Rozbudowa z przebudową chodnika ul. Marcinkowskiego w Świdnica – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji: 9 840,00 zł**
- **Termin realizacji: 30.06.2017 r. – 15.03.2018 r.**
- **Projektant:**
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”
mgr inż. Mariusz Szyrner

Przebudowa Al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – dokumentacja projektowa

- **Wartość inwestycji:** 122 385,00 zł
- **Termin realizacji:** 23.12.2016 r. - 15.09.2017 r.
- **Projektant:**
Sławomir Jagiełło „Studio Projekt” Bystrzyca Górna

Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji: 9 840,00 zł**
- **Termin realizacji: 30.06.2017 r. – 15.03.2018 r.**
- **Projektant:**
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr
inż. Mariusz Szyrner

Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** 55 350,00 zł
- **Termin realizacji:** 11.04.2018 r. – 31.08.2018 r.
- **Projektant:**
Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” mgr inż. Sławomir Jagiełło

Budowa zatoki postojowej wzdłuż
ul. Sybiraków w Świdnicy – dokumentacja
techniczna

- **Wartość dokumentacji:** 25 830,00 zł
- **Termin realizacji:** 29.03.2018 r. – 31.07.2018 r.
- **Projektant:**
- **Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” mgr inż. Sławomir Jagiełło**

Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** **51 400,00 zł**
- **Termin realizacji:** **04.10.2017 r. - 30.09.2018 r.**
- **Projektant:**
PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa Marcin Zięba

Budowa parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** 24 600,00 zł
- **Termin realizacji:** 07.09.2017 r. – 30.10.2018 r.
- **Projektant:**
„VIA ROMANA” drogi, projektowanie, nadzory Roman Konieczny

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej
nr 379) w Świdnicy – etapami – dokumentacja
techniczna

- **Wartość dokumentacji: 232 224,00 zł**
- **Termin realizacji: 04.04.2018 r. – 31.05.2019 r.**
- **Projektant: INGRAM Projekt Sp. z o.o.**

Budowa parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** 24 600,00 zł
- **Termin realizacji:** 07.09.2017 r. – 30.10.2018 r.
- **Projektant:**
„VIA ROMANA” drogi, projektowanie, nadzory Roman Konieczny

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej
nr 379) w Świdnicy – etapami – dokumentacja
techniczna

- **Wartość dokumentacji: 232 224,00 zł**
- **Termin realizacji: 04.04.2018 r. – 31.05.2019 r.**
- **Projektant: INGRAM Projekt Sp. z o.o.**

Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** **51 400,00 zł**
- **Termin realizacji:** **04.10.2017 r. - 30.09.2018 r.**
- **Projektant:**
PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa Marcin Zięba

Budowa parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy – dokumentacja techniczna

- **Wartość dokumentacji:** 24 600,00 zł
- **Termin realizacji:** 07.09.2017 r. – 30.10.2018 r.
- **Projektant:**
„VIA ROMANA” drogi, projektowanie, nadzory Roman Konieczny

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej
nr 379) w Świdnicy – etapami – dokumentacja
techniczna

- **Wartość dokumentacji: 232 224,00 zł**
- **Termin realizacji: 04.04.2018 r. – 31.05.2019 r.**
- **Projektant: INGRAM Projekt Sp. z o.o.**



Dziękujemy za uwagę

