

INWESTYCJE '15 I '16

Opracowanie: **Wydział Inwestycji Miejskich**

Stan na dzień
30.09.2017 r.

Ramowy plan prezentacji:

1. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu miasta
2. Wykaz inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich oraz Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej realizowanych w latach 2015-2017
3. Źródła finansowania inwestycji




CZĘŚĆ I: UDZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA




Wydatki inwestycyjne w latach 2007-2016 r.:

- ◆— Wydatki inwestycyjne w latach 2007-2015 [zł]
- Wydatki inwestycyjne w latach 2015-2016 [zł]

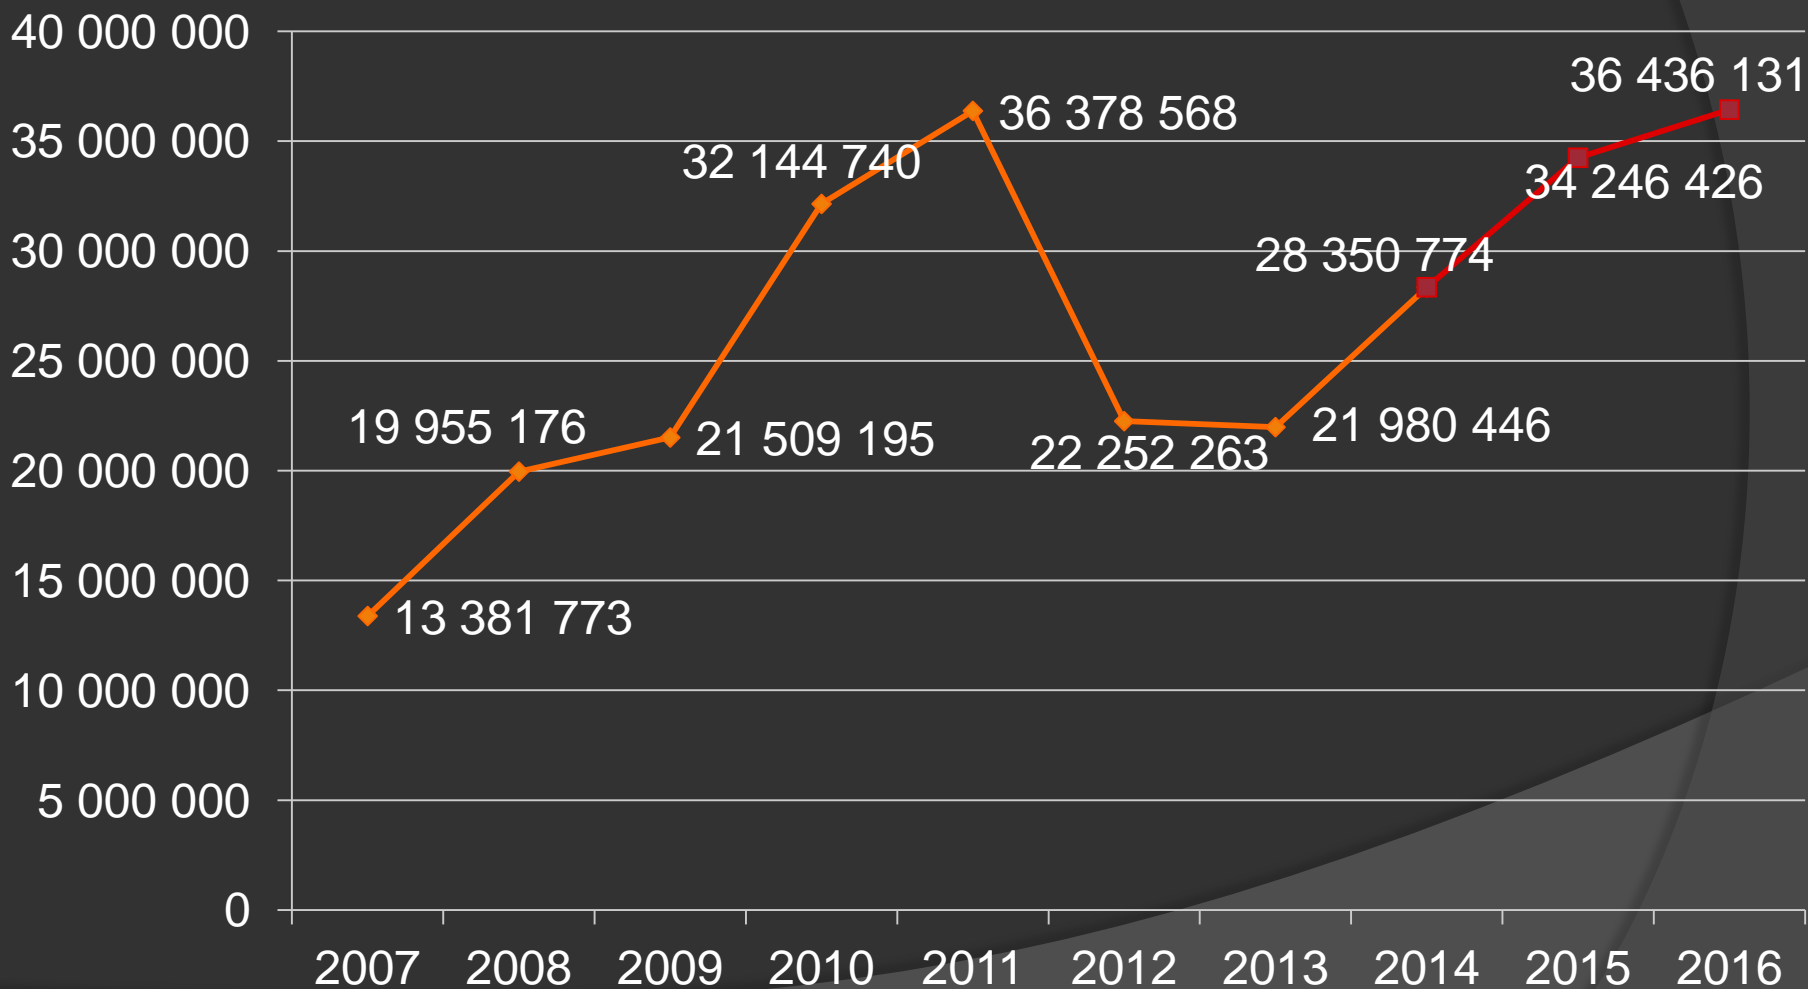

Relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków budżetowych

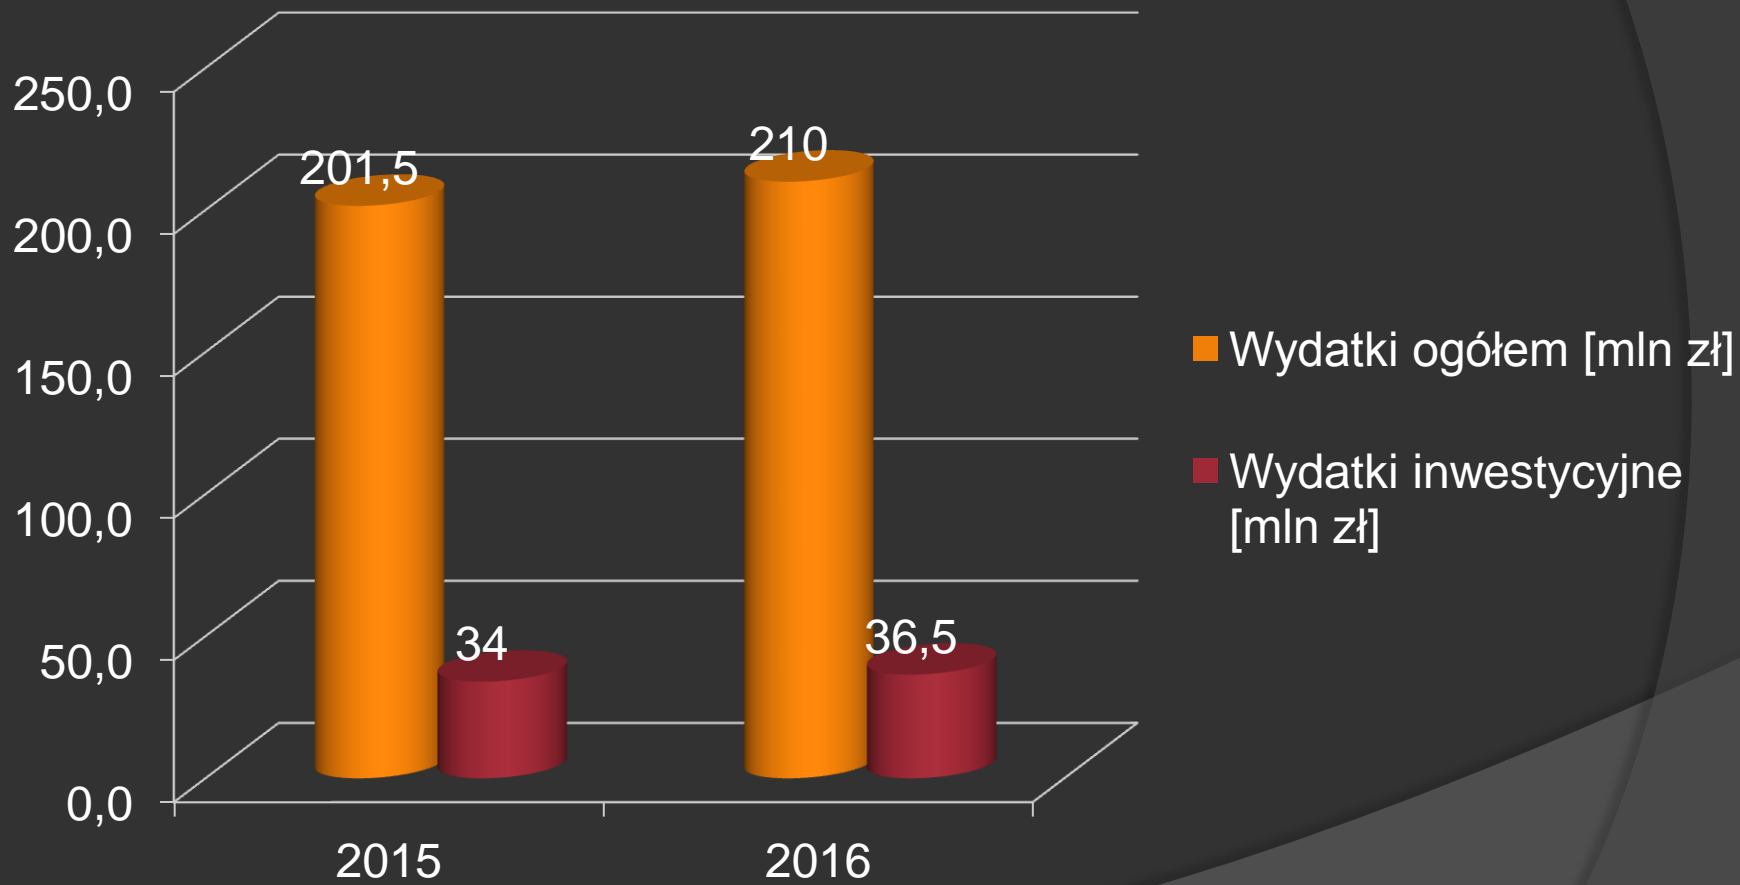



**CZĘŚĆ II:
WYKAZ INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ
INWESTYCJI MIEJSKICH ORAZ WYDZIAŁ DRÓG I
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ REALIZOWANYCH W LATACH
2015-2016**



Zadania zakończone

Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy



- Termin rozpoczęcia: **10.2010 r.**
- Termin zakończenia: **12.08.2015 r.**

- Koszt zadania (brutto): **25 201 937,50 zł**
- Wkład własny miasta: **11 365 520,32 zł**
- Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013: 13 836 417,18 zł**

- Wykonawca robót budowlanych:
SKANSKA S.A.

Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego



- ⦿ Termin rozpoczęcia: **03.06.2015 r.**
- ⦿ Termin zakończenia: **14.09.2015 r.**

- ⦿ Koszt zadania (brutto): **253 660,64 zł;**
W tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 4: **171 646,19 zł**
 - Przedszkole Miejskie Nr 14: **82 014,45 zł**

- ⦿ Wykonawca robót budowlanych:
**Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
Z Bielawy**

Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka - Westerplatte w Świdnicy - etap I

- Termin rozpoczęcia: **04.2014 r.**
- Termin zakończenia: **17.09.2015 r.**
- Koszt zadania (brutto): **2 800 237,34 zł**
- Wykonawca robót budowlanych:
**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Krzysztofa Zająca z Walimia**

Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminę Miasto Świdnica

- Termin rozpoczęcia:
19.08.2015 r.

- Termin zakończenia:
21.10.2015 r.

- Koszt zadania (brutto):
500 355,00 zł

- Wkład własny miasta: **312 064,00 zł**

- Dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „*Maluch*” – edycja 2015:
188 291,00 zł



Modernizacja mostu w parku Centralnym

- Termin rozpoczęcia:
14.05.2015 r.
- Termin zakończenia:
29.10.2015 r.
- Koszt zadania (brutto):
373 680,19 zł
- Wykonawca robót budowlanych:

TAUMER





Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkołe Podstawowej nr 8 , ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy




- Termin rozpoczęcia: **21.08.2015 r.**
- Termin zakończenia: **30.04.2016 r.**

- Koszt zadania (brutto): **739 091,58 zł**
- Wkład własny miasta: **488 391,58 zł**
- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: **250 700,00 zł**

- Wykonawca robót budowlanych:
Dabro – Bau

- Nagroda:

INWESTOR NA MEDAL 2017



Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego

- Termin rozpoczęcia:
30.12.2015 r.
- Termin zakończenia:
05.05.2016 r.
- Koszt zadania (brutto):
460 413,15 zł
- Wykonawca robót budowlanych:



Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Krzysztofa Zająca z Walimia

Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej etap I



- Termin rozpoczęcia:
11.03.2016 r.
- Termin zakończenia:
23.05.2016 r.
- Koszt zadania (brutto):
769 242,00 zł
- Wykonawca robót budowlanych:
FIRMA GUTKOWSKI

Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy

- Termin rozpoczęcia: **22.12.2016 r.**
- Termin zakończenia: **07.06.2017 r.**
- Koszt zadania (brutto): **256 309,37 zł**
- Wykonawca robót budowlanych:
TELFA Wacław Kruk

Zagospodarowanie skweru na placu 1000-lecia PP



- Termin rozpoczęcia: **03.2016 r.**
- Termin zakończenia: **07.07.2016 r.**
- Koszt zadania (brutto): **918 336,42 zł**
- Wkład własny miasta: **306 778,34 zł**
- Dofinansowanie z **NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)** „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy”:
421 367,91 zł
- Wykonawca robót budowlanych: **PARK-M**
- Projektant: **Sztuka Ogrodów - L`art Des Jardins**
- Nagroda:

MODERNIZACJA ROKU 2016



www.mojemiasto.swidnica.pl

Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływackiego

- Termin rozpoczęcia:

25.01.2016 r.

- Termin zakończenia:


02.12.2016 r.

- Koszt zadania (brutto):

984 976,87 zł

- Wykonawca robót budowlanych: **REJJS**





Budowa Schroniska dla zwierząt

- Termin rozpoczęcia:
21.01.2016 r.
- Termin zakończenia:
09.12.2016 r.

- Koszt zadania (brutto):
1 947 861,14 zł

- Wykonawca robót budowlanych:
Zakład Ogólnobudowlany Tadeusza Brońskiego





Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49

- Termin rozpoczęcia: **18.10.2015 r.**
- Termin zakończenia: **12.12.2016 r.**
- Koszt zadania (brutto): **1 937 070,52 zł**
- Wykonawca robót budowlanych: **Clima Heat s.j.**

Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy

- Termin rozpoczęcia:
28.06.2016 r.


- Termin zakończenia:
19.05.2017 r.

- Koszt zadania (brutto):
4 721 065,16 zł

- Dofinansowanie z programu „MALUCH – edycja 2016”:
2 391 326,00 zł

- Wykonawca robót budowlanych:
KBUD Krzysztof Łuksza



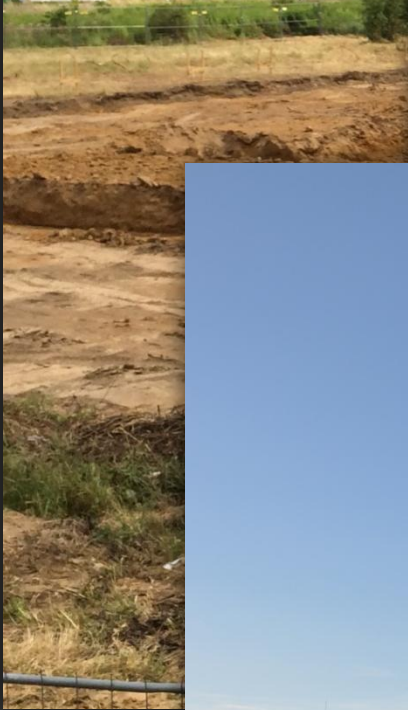

Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

- Termin rozpoczęcia:
09.02.2017 r.

- Termin zakończenia:
02.06.2017 r.

- Koszt zadania (brutto):
1 010 521,47 zł

- Wykonawca robót budowlanych: **DABRO-BAU**





Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy



- Termin rozpoczęcia: **8.09.2016 r.**
- Termin zakończenia: **30.06.2017 r.**

- Koszt zadania (brutto): **5 105 231,00 zł**
- Wkład własny miasta: **488 391,58 zł**
- Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki:
2 000 000,00 zł

- Nagroda:

INWESTOR NA MEDAL 2017



Przebudowa ul. Siennej



- Termin rozpoczęcia:

09.03.2017 r.

- Termin zakończenia:

30.06.2017 r.

- Koszt zadania (brutto):

462 473,36 zł

- Wykonawca robót budowlanych: **ŚPBDiM – Świdnickie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów**

Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej

- Termin rozpoczęcia:
17.05.2016 r.

- Termin zakończenia:
17.08.2017 r.

- Koszt zadania (brutto):
2 770 113,22 zł

- Wkład własny miasta:
1 536 793,88 zł

- Dofinansowanie z BGK:
1 233 319,34 zł

- Wykonawca robót budowlanych: **MTM Budownictwo**







Przebudowa ul. Podmiejskiej

• Termin rozpoczęcia:

20.07.2015 r.

• Termin zakończenia:

10.08.2015 r.

• Koszt zadania (brutto):

64 138,36 zł

Wykonawca robót budowlanych:

Budroad-Świdnica Dariusz Wrona

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ul. Mickiewicza do ul. Leśnej

- Termin rozpoczęcia:
08.07.2015 r.

- Termin zakończenia:
07.10.2015 r.

- Koszt zadania (brutto):
283 537,34 zł

- Dofinansowanie z budżetu państwa: **141 768,67 zł**

- Wykonawca robót budowlanych: **Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.**



Przebudowa ul. Legii Nadwiślańskiej

- Termin rozpoczęcia:
24.08.2015 r.
- Termin zakończenia:
12.10.2015 r.
- Koszt zadania (brutto):
107 453,53 zł
- Wykonawca robót budowlanych: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAŃCZYK" Spółka Jawna**

Przebudowa ul. Rolniczej

- Termin rozpoczęcia:
19.10.2015 r.
- Termin zakończenia:
01.12.2015 r.
- Koszt zadania (brutto):
147 612,30 zł
- Dofinansowane przez
prywatnego inwestora
PoloMarket: **118 827,84 zł**
- Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo wielobranżowe STAŃCZYK Spółka jawna



Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa – Etap II

- Termin rozpoczęcia:
21.08.2015 r.

- Termin zakończenia:
18.12.2015 r.

- Koszt zadania (brutto):
1 042 722,03 zł

- Wykonawca robót budowlanych:

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.





Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II


- Etap I - Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy obejmujący ulicę Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic bocznych, pętlę autobusową oraz przebudowę przepustu nad potokiem Jabłoniec - teren Gminy Miasto Świdnica,
- Etap II – Przebudowa drogi gminnej nr 112030D obejmujący teren Gminy Świdnica – wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nad Potokiem.



- Termin rozpoczęcia: **19.05.2015 r.**
- Termin zakończenia: **12.2015 r.**

- Koszt zadania (brutto): **4 367 728,75 zł**
- Wkład własny miasta: **1 666 038,59 zł**
- Dofinansowanie z „*Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych*”: **2 068 072,60 zł**,
dotacje celową z samorządu województwa: **300 000 zł**,
oraz środki finansowe wynikające z porozumienia międzygminnego (Gmina Świdnica): **333 617,56 zł**


- Wykonawca robót budowlanych:
**Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów,
EUROVIA**

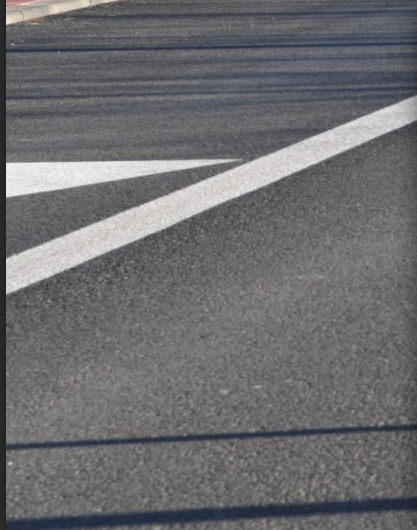

Przebudowa ul. Letniej

- Termin rozpoczęcia:
23.11.2015 r.
- Termin zakończenia:
16.05.2016 r.
- Koszt zadania (brutto):
157 075,92 zł
- Wykonawca robót budowlanych:

MAT-BRUK Jolanta Wilas-Matysiak

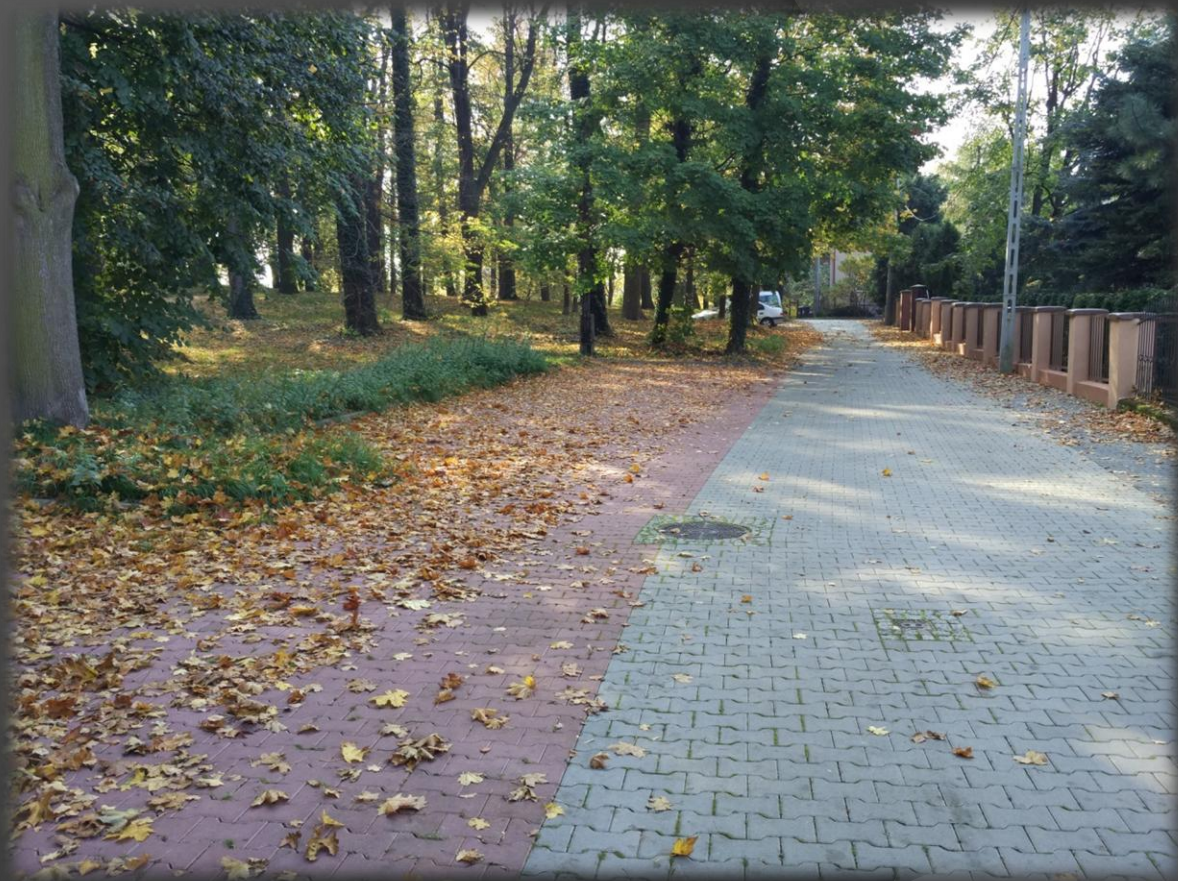

Przebudowa ul. Szczęśliwej

- Termin rozpoczęcia:
23.11.2015 r.
- Termin zakończenia:
16.05.2015 r.
- Koszt zadania (brutto):
102 249,90 zł
- Wykonawca robót budowlanych:

MAT-BRUK Jolanta Wilas-Matysiak



Przebudowa ul. Komunardów

- Termin rozpoczęcia:

10.12.2015 r.

- Termin zakończenia:


15.06.2016 r.

- Koszt zadania (brutto):

251 150,49 zł

Dofinansowanie z *Świdnickiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji*: **75 000,00 zł**

- Wykonawca robót budowlanych: **Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.**

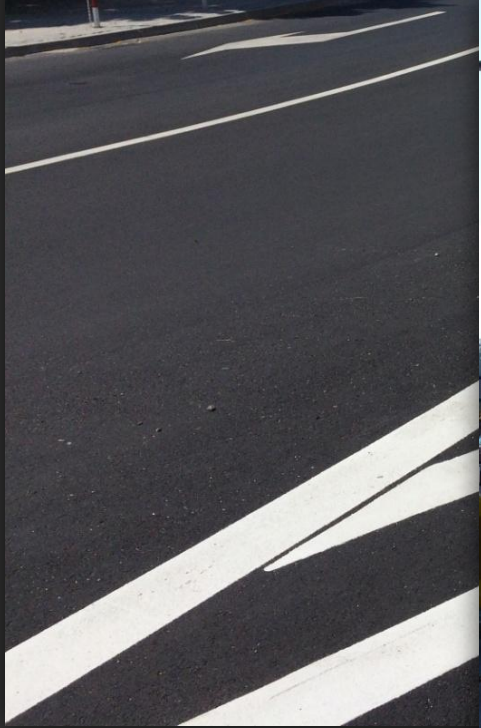


Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy

Etap I:

- Budowa chodnika dla pieszych i drogi dla rowerów,
- nasyp w sąsiedztwie rzeki,
- 40 miejsc postojowych,
- oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa,
- przebudowa kolidujących sieci,
- zjazdy na posesje.

Etap II:

- przebudowa istniejącej ulicy na odcinku od Wincentego Witosa do ul. Mikołaja Kopernika,
- przebudowa skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Mikołaja Kopernika,
- wykonanie 70 miejsc postojowych,
- oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa,
- ścieżka rowerową.
- przebudowa kolidującej sieci energetycznej.

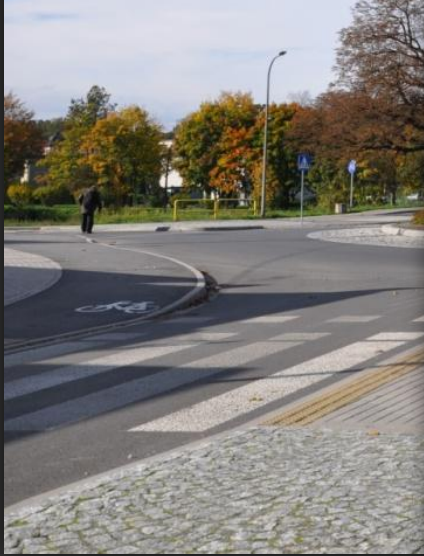

- Termin rozpoczęcia: **14.11.2014 r.**
- Termin zakończenia: **26.06.2015 r.**

ETAP I

- Koszt zadania (brutto): **3 682 008,65 zł**
- Wkład własny miasta: **910 799,55 zł**
- Dofinansowanie w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: 2 771 209,10 zł**

ETAP II

- Koszt zadania (brutto): **2 500 564,52 zł**
- Wkład własny miasta: **625 034,80 zł**
- Dofinansowanie w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: 1 875 529,72 zł**

- Wykonawca robót budowlanych: **BUDOSTAL-8**

Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (drogi wojewódzkiej nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda

- Termin rozpoczęcia:
20.08.2015 r.
- Termin zakończenia:
28.01.2016 r.
- Koszt zadania (brutto):
4 154 693,87 zł
- Wkład własny miasta:
1 529 693,87 zł
- Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: **2 625 000,00 zł**



- Wykonawca robót budowlanych: **ŚPBDiM – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów**

IM Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego

• Termin rozpoczęcia:

15.06.2015 r.

• Termin zakończenia:

14.02.2016 r.

• Koszt zadania (brutto):

1 001 688,67 zł

• Wkład własny miasta:

175 207,34 zł

• Dofinansowanie z DSDiK (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei):

826 481,33 zł

• Wykonawca robót budowlanych: **SKANSKA S.A.**



Rozbudowa ul. Śląskiej - parking

- Termin rozpoczęcia:
17.12.2015 r.
- Termin zakończenia:
31.03.2016 r.
- Koszt zadania (brutto):
249 260,73 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy – ul. Ceglana

- Termin rozpoczęcia:

30.12.2015 r.

- Termin zakończenia:

11.04.2016 r.

- Koszt zadania (brutto):

247 510,64 zł

- Wykonawca robót budowlanych: **Świdnickie**

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy

• Termin rozpoczęcia:
04.05.2016 r.

• Termin zakończenia:
17.08.2016 r.

• Koszt zadania (brutto):
1 853 254,82 zł

• Wkład własny miasta:
1 015 676,82 zł

• Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: **707 578,00 zł**,
oraz dotacji z Gminy Świdnica: **130 000 zł**

• Wykonawca robót budowlanych: **SKANSKA S.A.**



Przebudowa ul. Spółdzielczej w Świdnicy

- Termin rozpoczęcia:
28.06.2016 r.

- Termin zakończenia:
30.09.2016 r.

- Koszt zadania (brutto):
443 612,35 zł

- Dofinansowane
z *TBS Sp. z o.o.*: **30 683,85 zł**

- Wykonawca robót budowlanych:

Jerzy Majorek P.P.U.H Steinbudex - J.M.





Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej w Świdnicy

- Termin rozpoczęcia:

01.08.2016 r.

- Termin zakończenia:

30.11.2016 r.

- Koszt zadania (brutto):

165 600,50 zł

- Wykonawca robót budowlanych: **Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "STAŃCZYK" Spółka Jawna**

Przebudowa drogi woj. nr 379 – od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica

- Termin rozpoczęcia:

29.08.2016 r.

- Termin zakończenia:

30.11.2016 r.

- Koszt zadania (brutto):

839 314,89 r.

- Dofinansowanie

z budżetu województwa: 419 657,45 zł

- Wykonawca robót budowlanych:

ŚPBDiM Sp. z o.o. Świdnica



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo- rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej

- Termin rozpoczęcia:

30.11.2016 r.

- Termin zakończenia:

06.04.2017 r.

- Koszt zadania (brutto):

280 455,01 zł

- Dofinansowanie

z Gminy Miasta Świdnica: 140 227,51 zł

- Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” Sp. j. Świebodzice



Przebudowa drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 2

- Termin rozpoczęcia: **30.12.2016 r.**
- Termin zakończenia: **28.04.2017 r.**

- Koszt zadania (brutto): **147 588,09 zł**

- Wykonawca robót budowlanych:
ŚPBDiM Sp. z o.o. Świdnica


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej

- Termin rozpoczęcia: **30.11.2016 r.**
- Termin zakończenia: **30.04.2017 r.**

- Koszt zadania (brutto): **431 814,44 zł**
- Dofinansowanie z **Gminy Miasta Świdnica: 215 907,22 zł**

- Wykonawca robót budowlanych:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” Sp. j.
Świebodzice**



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie skrzyżowania ulic Przemysłowej i Kopernika

- Termin rozpoczęcia:
13.09.2016 r.

- Termin zakończenia:
30.04.2017 r.

- Koszt zadania (brutto):
767 026,87 zł

- Dofinansowanie
z budżetu województwa:
702 341,98 zł

- Wykonawca robót budowlanych:
SKANSKA S.A. Wrocław



Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica

•Termin rozpoczęcia:

11.08.2015 r.

•Termin zakończenia:

31.05.2017 r.

•Koszt zadania (brutto):

481 146,51 zł

Wykonawca robót budowlanych:

STAŃCZYK Sp. j. Świebodzice;

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.;

Budroad-Świdnica Dariusz Wrona

Zadanie obejmuje budowę zatok przy ulicach:

- Ul. H. Brodatego
- Ul. Kilińskiego
- Ul. Langiewicza
- Ul. Odnowiciela
- Ul. Prądyńskiego

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

- Termin rozpoczęcia:
26.06.2015 r.
- Termin zakończenia:
31.05.2017 r.
- Koszt zadania (brutto):
1 950 170,73 zł





Wykaz przebudowanych chodników:

- Ul. H. Brodatego,
- Ul. Ofiar Oświęcimskich,
- Ul. T. Kościuszki,
- Oś. Zawiszów,
- Ul. Kanonierska,
- Ul. Wrocławska,
- Ul. Wileńska,
- Ul. Świętojańska,
- Ul. M. Skłodowskiej – Curie,
- Ul. Zamenhofa,
- Os. Zwierzynieckie,
- Ul. Prądzyńskiego,
- Ul. Świerkowa,
- Ul. Krakowska,
- Ul. Dąbrowskiego,
- Ul. Parkowa,
- Ul. Armii Krajowej,
- Ul. Reja,
- Ul. Saperów,
- Ul. Waryńskiego,
- Ul. Marcinkowskiego,
- Ul. Wróblewskiego,
- Ul. Mazowiecka,
- Ul. Wyszyńskiego,
- Ul. Słowiańska,
- Ul. Rycerska,
- Pl. Wojska Polskiego,
- Ul. Jagiellońska.

Przebudowa Al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – dokumentacja projektowa

- Termin rozpoczęcia: **23.12.2016 r.**
- Termin zakończenia: **15.09.2017 r.**
- Koszt zadania (brutto): **122 385,00 zł**
- Projekt: **Sławomir Jagiełło „Studio Projekt”
Bystrzyca Górna**

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. R. Traugutta i Al. Niepodległości – dokumentacja projektowa

- Termin rozpoczęcia: **20.04.2017 r.**
- Termin zakończenia: **29.09.2017 r.**
- Koszt zadania (brutto): **17 220,00 zł**
- Projekt: **M. Szyrner PROGRESS, Roztoka**

Cmentarze:


- Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach zadania Budowa Platformy Cyfrowej w mieście Świdnica - stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi

Oświetlenie:

- Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla
- Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki
- Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

Oświetlenie:

- Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych (ul. Zamenhofa, ul. Sikorskiego, ul. Westerplatte)
- Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim
- Przebudowa oświetlenia terenu garaży przy ul. Zwierzynieckiej
- Budowa oświetlenia ul. Czereśniowa
- Przebudowa oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina

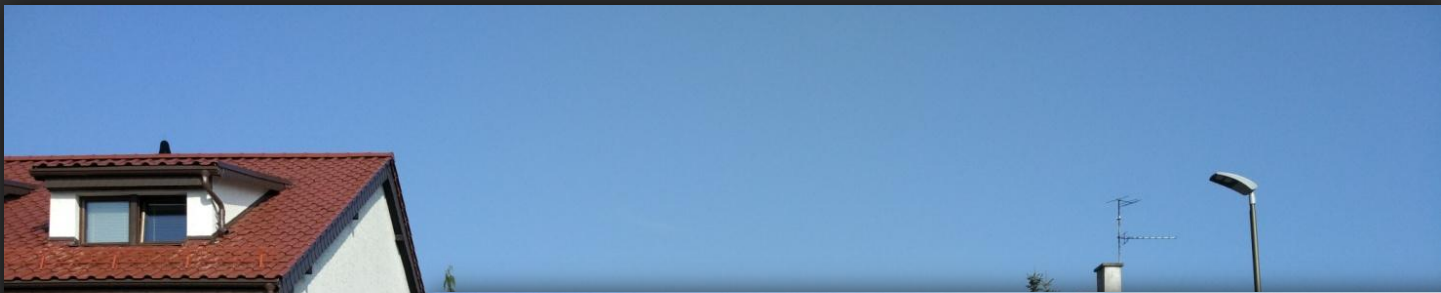

Oświetlenie:

- Przebudowa oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza
- Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej w Świdnicy (na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Westerplatte)
- Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze
- Przebudowa oświetlenia w parku Kanonierów
- Budowa oświetlenia ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego
- Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Kazimierza Wielkiego/al. Colgate/T. Ząbka
- Budowa oświetlenia alejki w Parku Zawiszowskim przy ul. Łukasińskiego



Obiekty rekreacyjne:


- Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na placu Wojska Polskiego
- Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego
- Budowa placu zabaw w centrum tzw. „Plastra Miodu”
- Budowa placów zabaw na terenie miasta Świdnicy:
 - w pobliżu szkoły podstawowej „Bliżej dziecka” przy ul. Jagiellońskiej,
 - na terenie zieleni w pobliżu komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kopernika 3,
 - na skwerze przy ul. Kraszowickiej





Obiekty rekreacyjne:

- Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Przemysłową , a Mazowiecką w Świdnicy
- Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy – Park Kanonierów i Park Ułanów
- Rewitalizacja skweru przy ul. Michała Drzymały w Świdnicy
- Budowa alejek w parkach miejskich – wykonanie alejki w parku Zawiszowskim na ul. Łukasińskiego

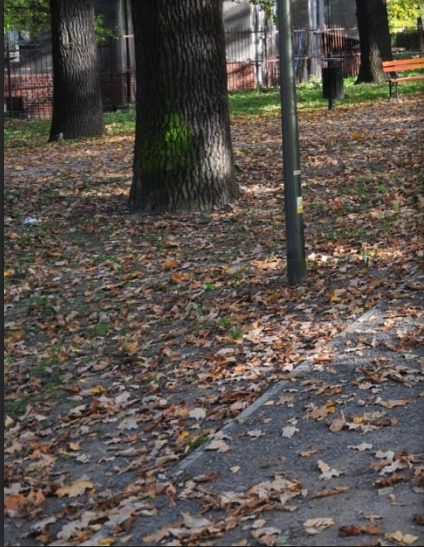

Instalacje sanitarne:

- Przebudowa Szaletu przy ul. Św. Małgorzaty
- Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej
- Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy



Kwoty przeznaczone na finansowanie poszczególnych zbiorów zadań:

- **Cmentarze: 206 545,65 zł**
- **Oświetlenie: 1 283 839,78 zł**
- **Obiekty rekreacyjne: 1 715 945,20 zł**
- **Instalacje sanitarne: 316 153,74 zł**

W trakcie....

Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej




Zadanie obejmuje:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika
 - Zadanie 1: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika
 - Zadanie 2: Przebudowa oświetlenia ulicy M. Kopernika w Świdnicy
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej
- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Zawiszów
- Rozbudowa ulic Jana Korczaka i Leśnej w Świdnicy



- Termin rozpoczęcia: **12.01.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **30.11.2017 r.**
- Przewidywany koszt zadania (brutto):
7 900 942,97 zł
- Wkład własny miasta: **1 193 875,37 zł**
- Dofinansowanie z RPO WD 2014-2020:
6 707 067,60 zł
- Wykonawca robót budowlanych:
ŚPBDiM Sp. z o.o., MOST Sp. z o.o., ZRT TELFA

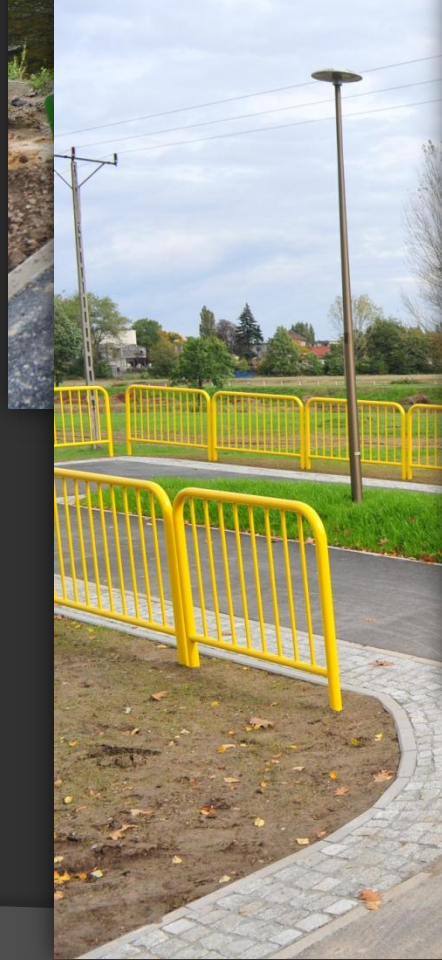

Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy

- Termin rozpoczęcia: **20.05.2017 r.**
- Przewidywany termin
zakończenia: **31.10.2017 r.**
- Przewidywany koszt zadania (brutto):
1 369 904,54 zł
- Do tej pory wydano: **67 650,00 zł**
- Wykonawca robót budowlanych:
ŚPBDiM Sp. z o.o. Świdnica

Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej

- Termin rozpoczęcia:
03.10.2017 r.
- Przewidywany termin
zakończenia:
15.12.2017 r.
- Koszt zadania (brutto):
250 000 zł
- Wykonawca robót budowlanych: **Przedsiębiorstwo
Usługowo-Budowlane Robert Kleniuk**



Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy

- Termin rozpoczęcia: **06.06.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **11.2017 r.**
- Przewidywany koszt zadania (brutto): **2 126 659,74 zł**
- Dofinansowanie z **Gminy Miasto Świdnica: 250 000,00 zł**
oraz ze środków **Wojewody Dolnośląskiego: 826 902,00 zł**
- Wykonawca robót budowlanych:
ŚPBDiM Sp. z o.o. Świdnica



Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a



- Termin rozpoczęcia: **17.03.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **15.12.2017 r.**
- Koszt zadania (brutto): **7 414 938,51 zł**
- Wkład własny miasta: **5 914 938,51 zł**
- Dofinansowanie z **Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – Edycja 2016:**
1 500 000,00 zł
- Do tej pory wydano: **1 309 820,50 zł**
- Wykonawca robót budowlanych: **SALTEX EUROPA Sp. z o.o.**

Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne

Na całe zadanie składa się 16 lokali:

- Ul. Długa 4/18, 19/6, 25/3
- Ul. Jagiellońska 16/2
- Ul. Pułaskiego 55/9
- Ul. Lelewela 14/2, 16/1
- Ul. Westerplatte 16/4a, 37a – 4 lokale
- Ul. Garbarska 9/2, 9/4
- Plac Ludowy 6/14
- Plac Św. Małgorzaty 9/1, 9/4

- Do tej pory wykonano roboty modernizacyjne w **8 lokalach**
- Dla **6 lokali** Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dopląt na tworzenie lokali socjalnych w **wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych**
- Dla kolejnych **4 lokali** trwają procedury przygotowawcze


- Planowany termin rozpoczęcia: **14.05.2016 r.**
- Przewidywany termin zakończenia:
IV kwartał 2018 r.

- Koszt zadania (brutto): **1 326 602,86 zł**
- Dofinansowanie z BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego): **296 818,34 zł**
- Do tej pory wydano: **1 293 740,95 zł**

Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej - program KAWKA

Zadaniem zostały objęte budynki znajdujące się przy ulicach:

- Siennej,
- Wrocławskiej,
- Parkowej,
- Saperów,
- Kościelnej,
- Wodnej,
- Dębowej,
- Jodłowej,
- Kołłątaja,
- Okrężnej,
- Sikorskiego,
- Ofiar Oświęcimskich,
- Siostrzanej,
- Franciszkańskiej,
- Grodzkiej,
- Rynek,
- Pułaskiego,
- Teatralnej,
- Niecałej,
- Ks. Bolka Świdnickiego,
- Św. Agnieszki,
- Św. Małgorzaty,
- Łukasińskiego

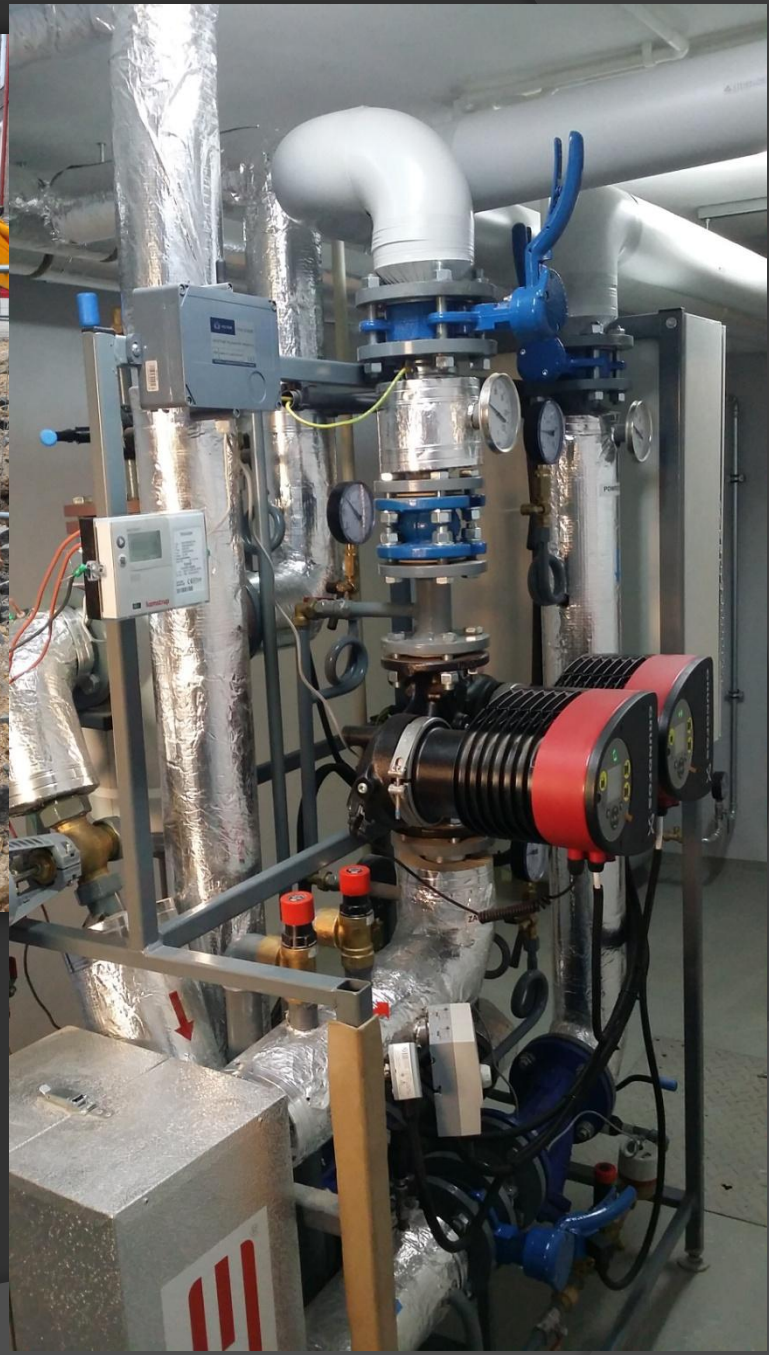

- Termin rozpoczęcia: **25.05.2016 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **22.10.2018 r.**

- Koszt zadania (brutto): **14 786 753,64 zł**
- Wkład własny miasta: **7 664 753,64 zł**
- Dofinansowanie z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu** : **7 122 000,00 zł**

Rewaloryzacja parku Centralnego



Rewaloryzacja Parku Centralnego obejmuje:

- Budowę fontanny,
- Przebudowę, odbudowę i renowację schodów terenowych i rozarium oraz budowę altanki wraz ze schodami
- Wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej
- Budowę budynku toalety
- Budowę alejek i ścieżek rowerowych
- Przebudowę 3 obiektów mostowych,
- Rewaloryzację zieleni

Poza zadaniem inwestycyjnym wykonano także inne zadania przygotowawcze:

- „Rewaloryzacja Parku Centralnego – Zwiększenie drożności korytarza ekologicznego na terenie Parku Centralnego w Świdnicy, poprzez remont i przebudowę akwenów wodnych”
- Usunięcie i pielęgnacja drzew i krzewów w parku Centralnym w Świdnicy realizowanego w ramach zadania „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”



- Termin rozpoczęcia: **07.02.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **28.09.2018 r.**

- Koszt zadania (brutto): **10 589 985,12 zł**
- Wkład własny miasta: **4 698 838,31 zł**
- Dofinansowanie z NFOŚiGW „*Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy*”: **5 891 146,81 zł**









Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy




Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 obejmuje:

- Zespół sportowo-rekreacyjny Basenu Krytego oraz Budynku Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy
- Budynek Przedszkolny „Bartek”



- Termin rozpoczęcia: **02.06.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **29.12.2019 r.**
- Przewidywany koszt zadania (brutto): **16,6 mln**
- Dofinansowanie z ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskich): nie więcej niż **48,57% wydatków kwalifikowanych**
 - 1 988 841,93 zł** – Budynek Szkoły Podstawowej nr 4
- Do tej pory wydano: **2 254 857,14 zł**
- Wykonawca robót budowlanych: **ROKOM H.G.I. Komorowscy Sp. j.**

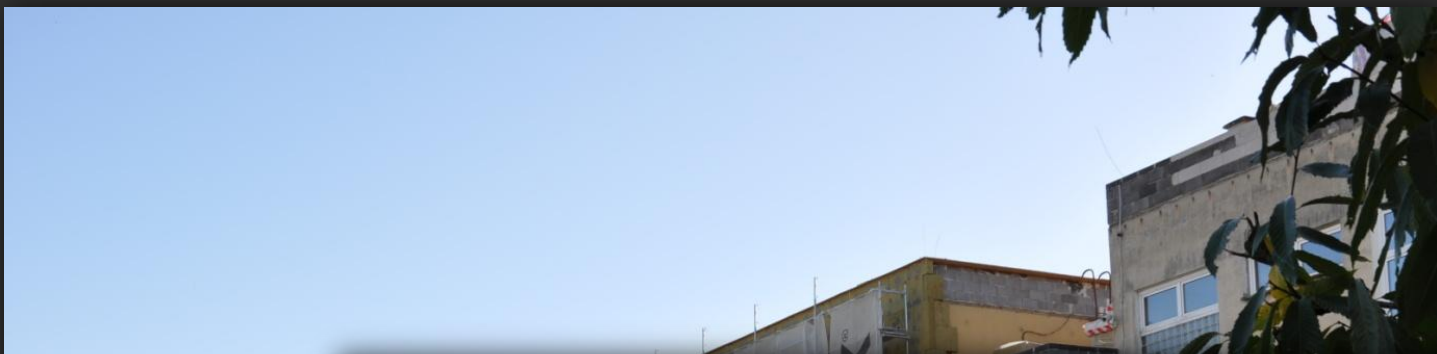

Zadania w przygotowaniu

Budowa sięgacza przy ul. Leśnej



- Planowany termin rozpoczęcia: **18.10.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **31.03.2018 r.**
- Przewidywany koszt zadania (brutto): **1 056 926,61 zł**

Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy

- Planowany termin rozpoczęcia zadania:
11.2017 r.
- Przewidywany termin zakończenia zadania:
30.04.2018 r.
- Przewidywany koszt zadania (brutto):
279 632,65 zł

Skała 1:500

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WIELKOŚĆ DZIAŁKI

WIELKOŚĆ CZĘŚCI REKREACYJNEJ 15271,68 m²

GRZB SPORTOWYCH w tym boiska 4903,73 m²

- OCEBIS STARSZYCH 1883,80m²

- w tym siłownia 5471,2m²

- OCEBIS MŁODSZYCH 1555,70m²

- w tym plac zabaw 801,70m²

- OCEBIS MŁODSZYCH w tym plac zabaw 2106,33m²

866,76m²

CIĄGI PRZEZIE UTWARZONE 813 m²

ALEJKI PLACU ZWIRKOWE 595m²

DRZWI DOJAZDOWA 196m²

PARKING

- LEGENDA:**
- LAWKA Z OPARCIEM Ø 200 szer. 50cm
 - KOŁEZ NA ŚMIECI betonowy z włóknem 60 lit.
 - URZĄDZENIA PLACU ZABAW
 - KOMPOZYCJA ROŚLINNA OZDOBNA (propozycja)
 - wierzba purpurowa Salix purpurea
 - jaśminec bł. czap. Juniperus Blue Carpet
 - ośk. pospolity Taxus baccata Repardiana
 - KOMPOZYCJA ROŚLINNA OZDOBNA (propozycja)
 - ośk. pospolity Taxus baccata
 - zysownik zachodni Thuja occidentalis
 - zysownik wschodni Thuja orientalis
 - DRZEWA OZDOBNE (propozycja)
 - wierzba oszklona Fraxus ornamentalis Globosa
 - klon zwykły Aker platanoides globosum
 - ZIELEŃ IZOLUJĄCA (propozycja)
 - klon kolumnowy Acer platanoides columnare
 - ZYWIORLOTY (propozycja)
 - ryga Włocząca Cotoneaster lucida
 - karagana szybera Caragana arborescens
 - TRAWNIKI
 - mięszki gatunków traw na trawniki ozdobne
 - mięszki gatunków traw na trawniki użytkowe (sportowe)
 - OSWIETLENIE
 - lampiony parkowe wys. 4m co 15-20m
 - lampiony uliczne z wysięgnikiem wys. 8m co 15-20m
 - ETAP REALIZACYJNY (określenie zakresu zamierzonych 2009m²)
 - II ETAP REALIZACYJNY (określenie zakresu zamierzonych 3100 m²)

BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO
15,0x32,0 m
 nawierzchnia trawiasta lub ulepszona



REZERWA TERENU
pow. 2146 m²

BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ
27,3x43,6 m
 nawierzchnia trawiasta lub ulepszona

boisko lekkoatletyczne 14x26m, 14x12,5m (naturalna ulepszone ew. bitumiczne)

boisko piłki siatkowej 22x44m (naturalna ulepszone ew. trawiasta)

boisko piłki siatkowej 9x18m (naturalna ulepszone)

PLAC DZIECI MŁODSZYCH

- zestaw "Integracyjny" szt.1
- huśtawka podwieszona "Praktyczny" szt.2
- huśtawka węgowna "Wesoła" szt.1
- zjeżdżalnia "Mister" młody szt.3
- zjeżdżalnia "Krośka" szt.1

PLAC DZIECI STARSZYCH

- zestaw "podwórko 01" szt.1
- huśtawka podwieszona "Tęczy" szt.2
- drapieżnia "Pocieszna" szt.1
- zestaw "drabinka 01" szt.1
- zjeżdżalnia "Wesoła" szt.1

TEREN REKREACYJNY PRZY ULICY PRĄDZYŃSKIEGO W ŚWIDNICY			
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Skala:	1:500		
Wzrost:	GMINA MIASTO ŚWIDNICA		nr rysunku: 1/A
Lokalizacja:	ŚWIDNICA Os. Miłoczych AM. dz. obręb		data: 07/2003
Projektant/podpis:	Zbigniew SKAPSKI	Projektant/podpis:	Projektant/podpis:

Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne



- Planowany termin rozpoczęcia: **15.12.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **30.10.2018 r.**
- Przewidywany koszt zadania (brutto):
2 466 906,16 zł
- Dofinansowanie z projektu ze środków **RPO WD (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego) na lata 2014-2020**: do 85% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę – **1 759 488,85 zł**

Inspektor: M. Suchowińska

Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane



- Planowany termin rozpoczęcia: **14.11.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **30.10.2018 r.**
- Planowany koszt zadania (brutto):
3 998 300,31 zł
- Dofinansowanie z projektu ze środków **RPO WD (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego)** na lata **2014-2020**: do **85% kosztów kwalifikowanych** z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę: **2 863 884,99 zł**

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima 1 - Etap II



- Termin rozpoczęcia:
IV kwartał 2017 r.
- Przewidywany
termin zakończenia:
31.08.2018 r.
- Przewidywany koszt zadania (brutto): **3 599 007,44 zł**

Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy

- Planowany termin rozpoczęcia: **I kwartał 2018 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **IV kwartał 2018 r.**

- Przewidywany Koszt zadania (brutto): **3 442 159,09 zł**
- Wkład własny miasta: **985 928,57 zł**
- Dofinansowanie z ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskich): **2 513 524,20 zł**



Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku



- Termin rozpoczęcia: **10.2017 r.**
- Przewidywany termin zakończenia: **12.2018 r.**

- Koszt zadania (brutto): **1 970 201,67 zł**
- Wkład własny miasta: **354 915,50 zł**
- Dofinansowanie z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska-Polska:**
1 615 286,17 zł

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy

- Termin rozpoczęcia:
IV kwartał 2017 r.
- Przewidywany termin
zakończenia: **31.10.2018 r.**

• Koszt zadania (brutto):
1 900 336,67 zł

• Wkład własny miasta: **285 050,50 zł**

• Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego: **1 615 286,17 zł**



Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami



- **I Etap:**

Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na placu graniczącym ze Szpitalem Latawiec


- **II Etap:**

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą podziemną ul. Korczaka

- Planowany termin rozpoczęcia całego zadania:
I kwartał 2018 r.

- Przewidywany termin zakończenia całego zadania:
IV kwartał 2018 r.


- Przewidywany koszt zadania (brutto):
800 000,00 zł

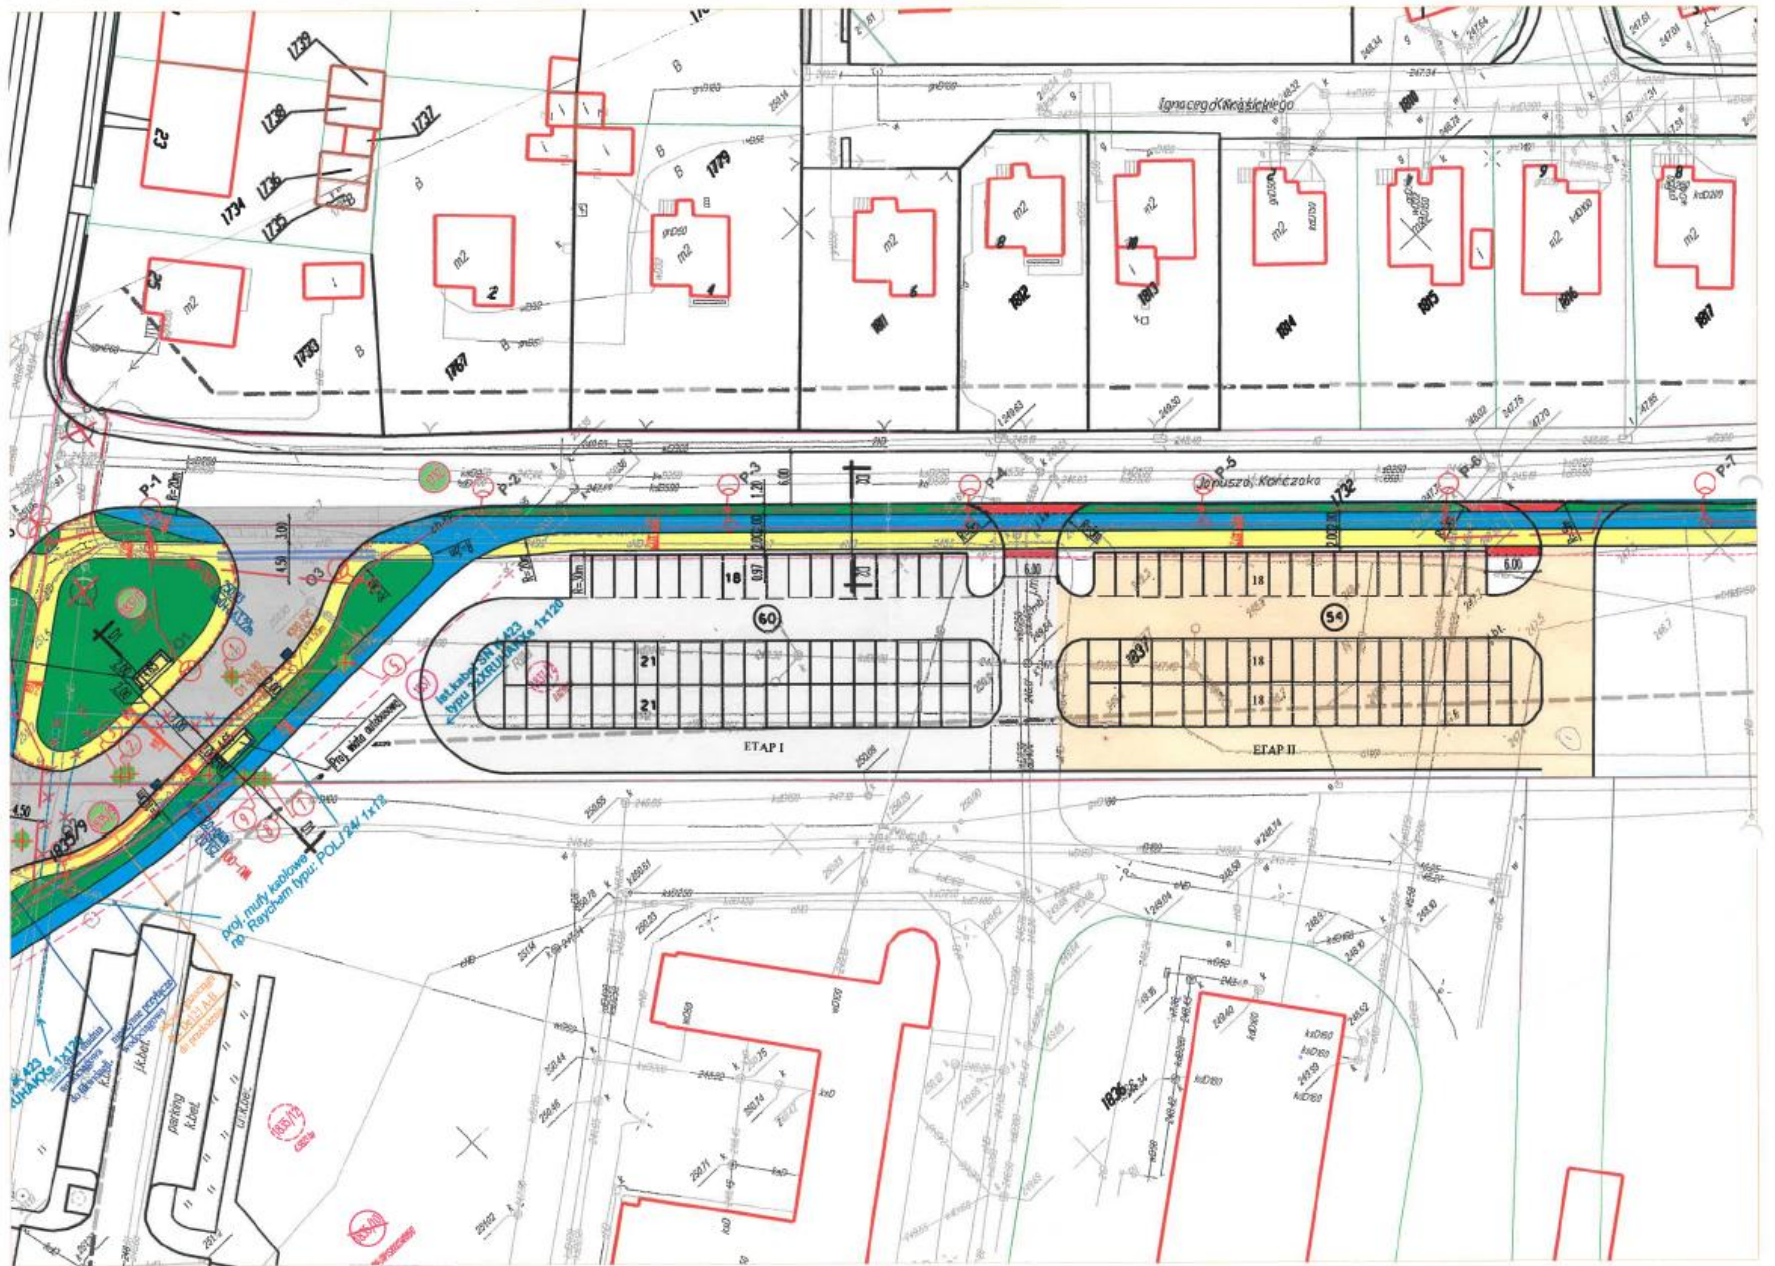




CZĘŚĆ III: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI


Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji unijnych w latach 2015 – 2017r.

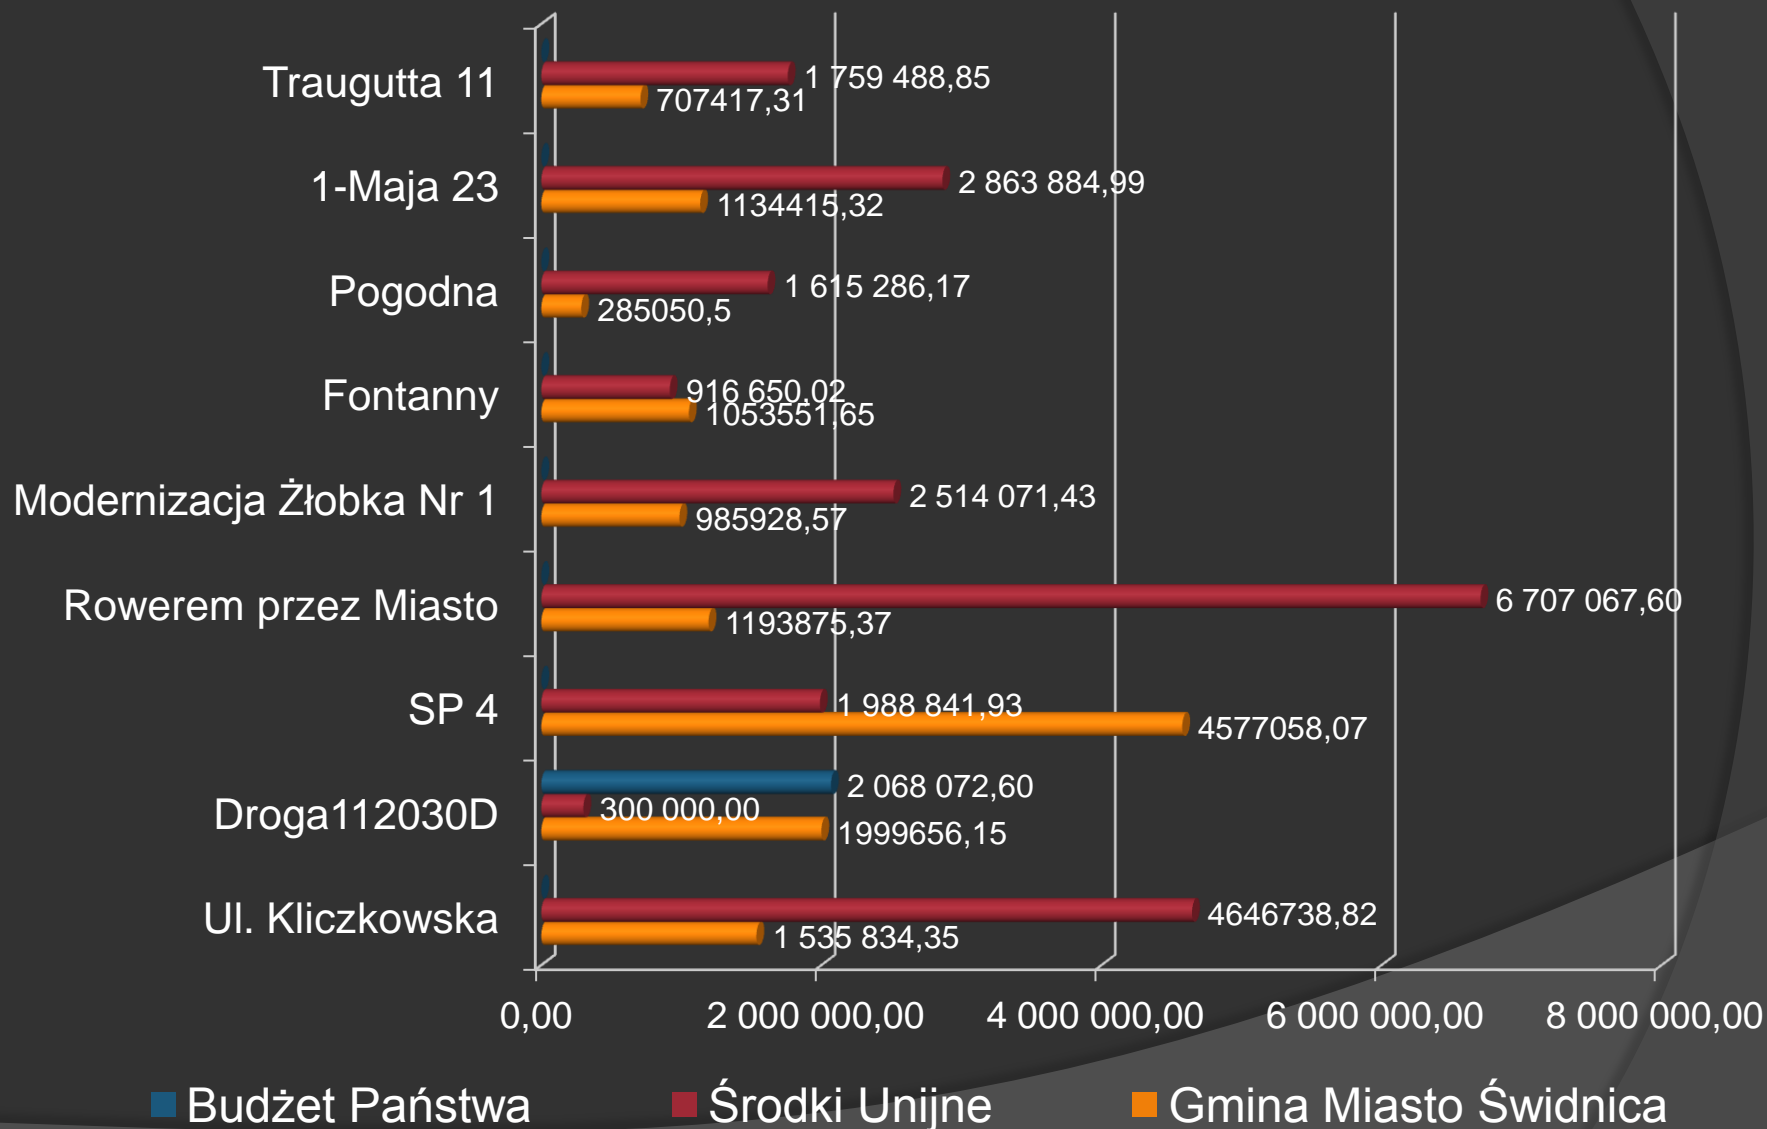


Procentowy udział wartości dotacji w wartości zadania inwestycyjnego

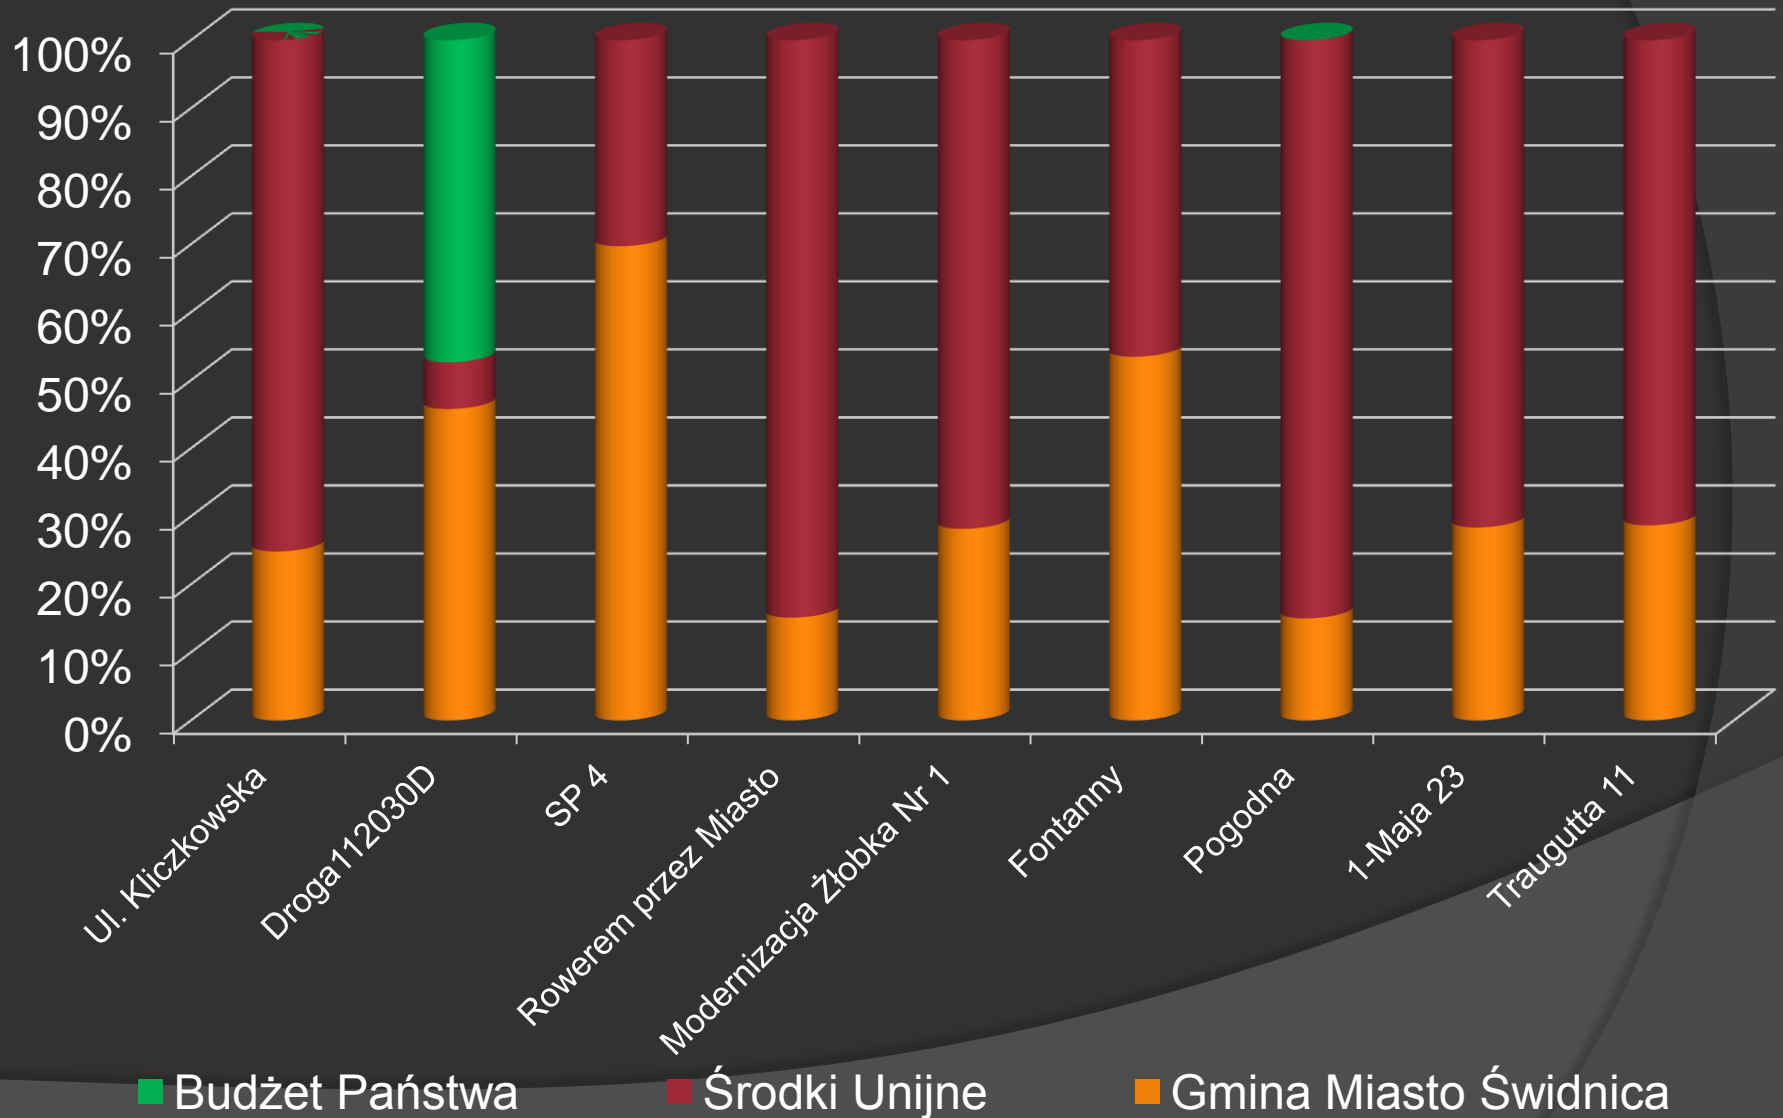

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji w latach 2015 – 2017r.:

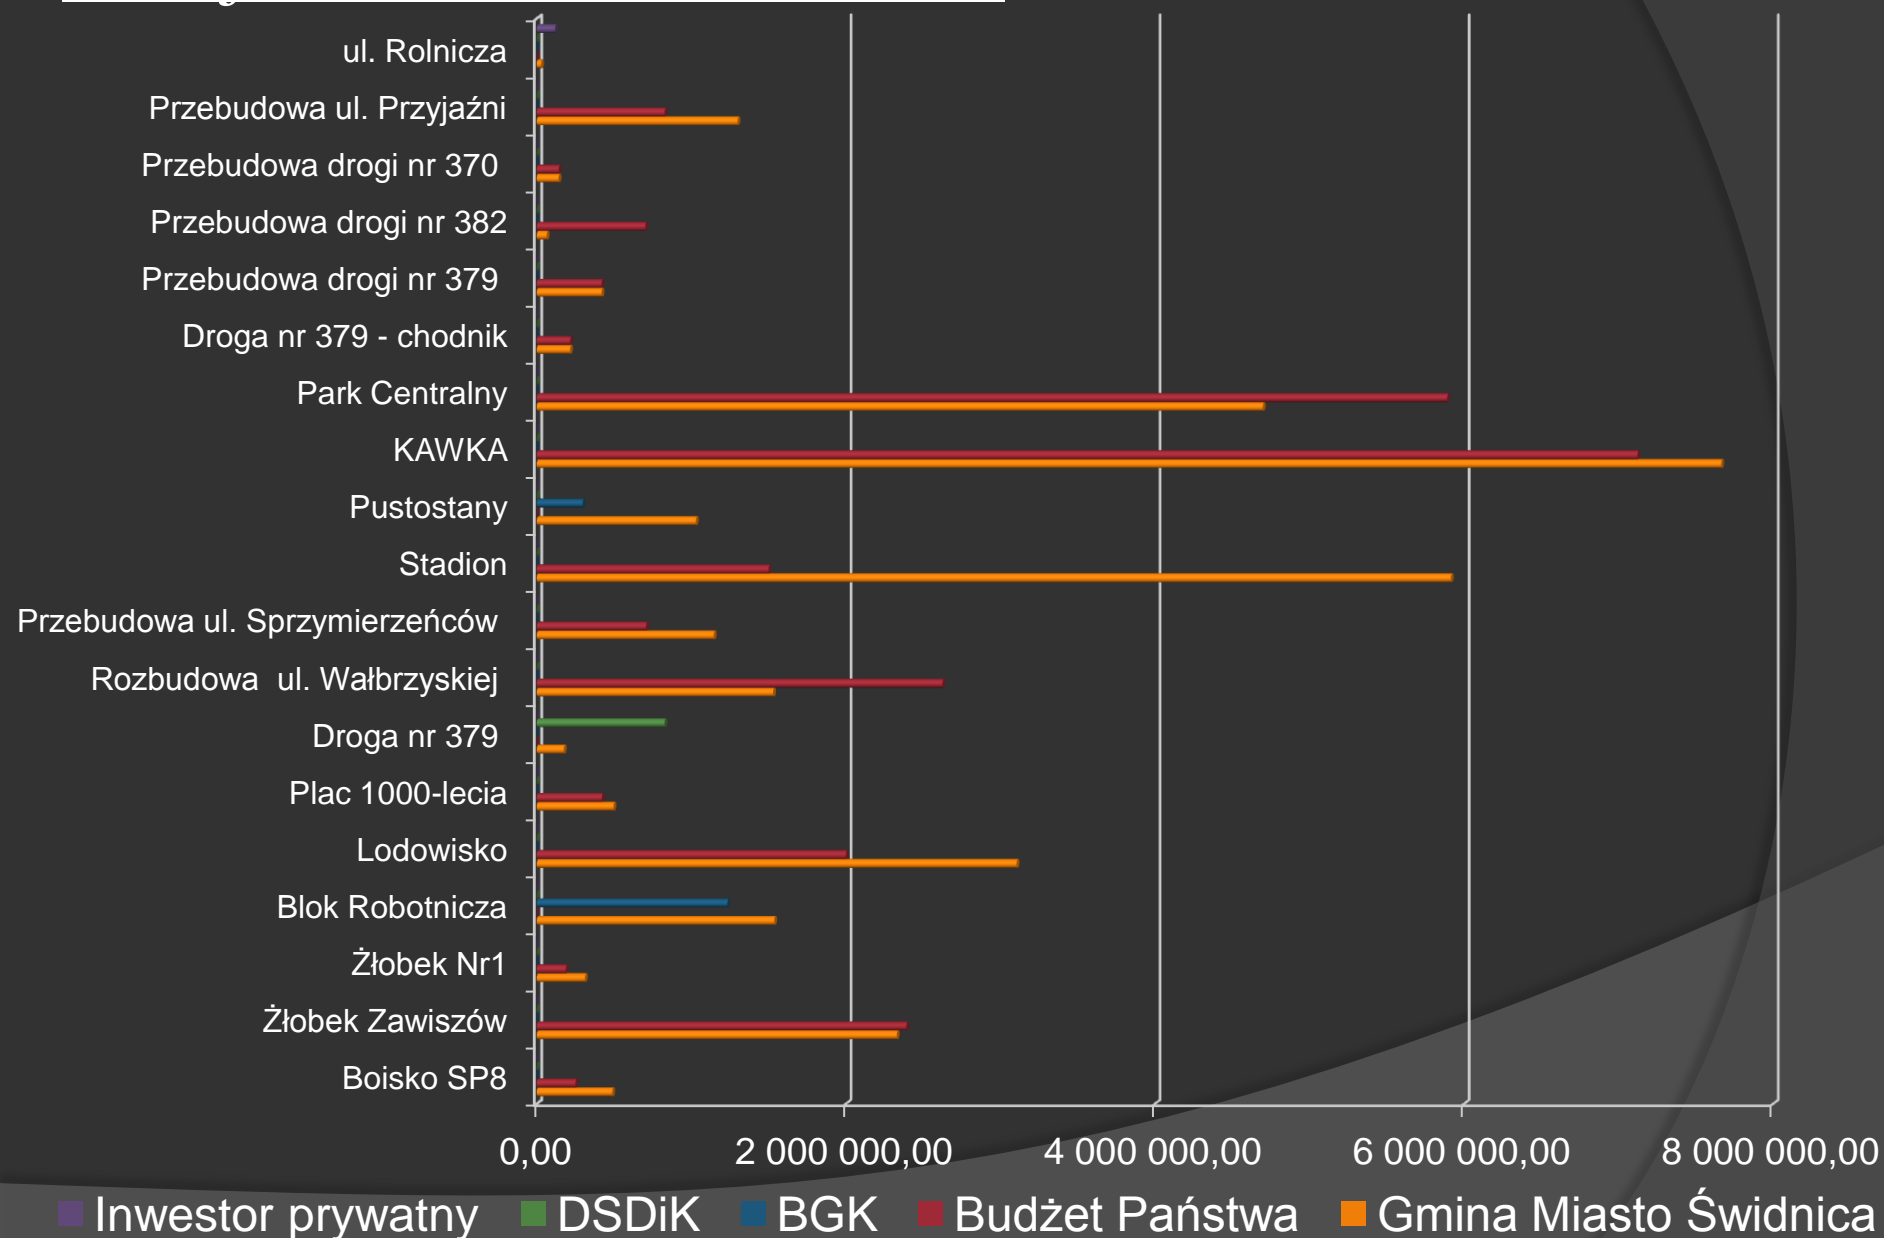

Procentowy udział wartości dotacji w wartości zadania inwestycyjnego

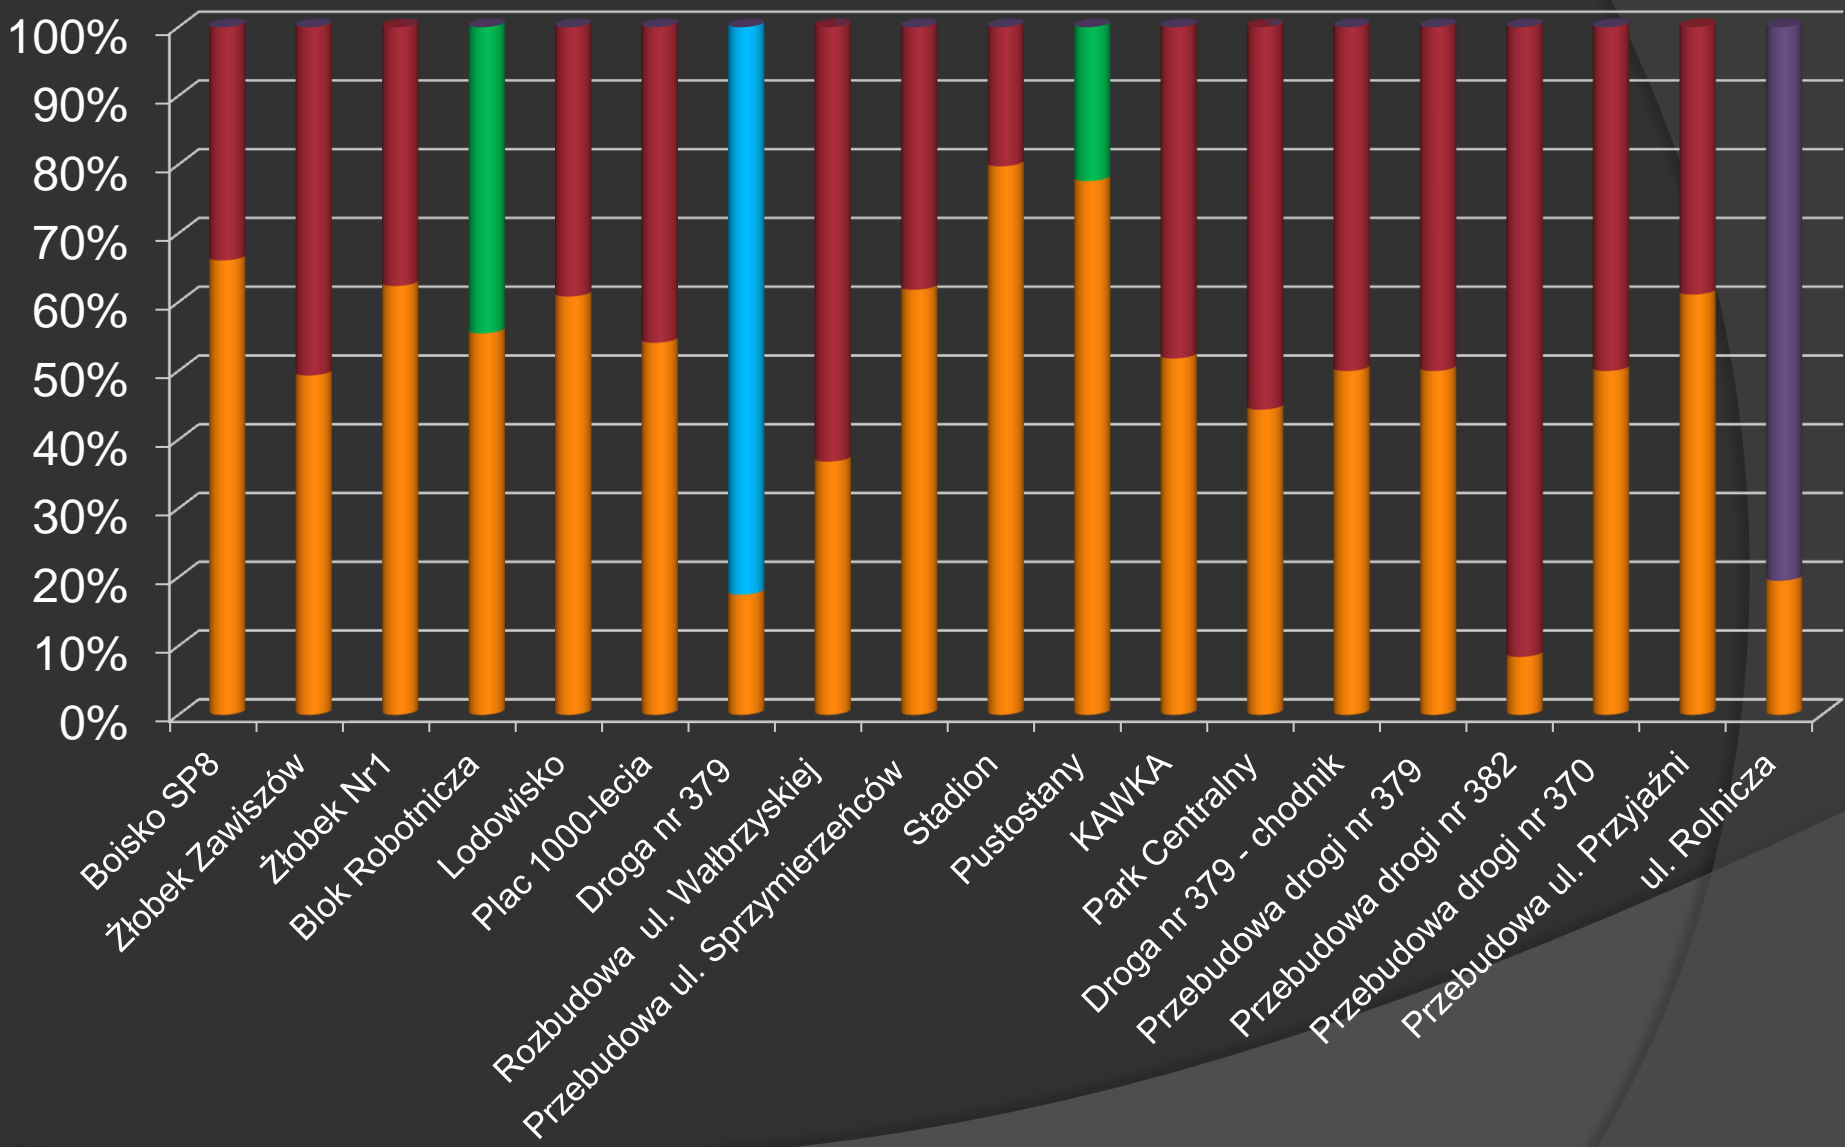


■ Inwestor prywatny
 ■ DSDiK
 ■ BGK
 ■ Budżet Państwa
 ■ Gmina Miasto Świdnica

Wykaz otrzymanych dotacji na inwestycje prowadzone w latach 2015 – 2017 r.:

- Dofinansowanie z *Banku Gospodarstwa Krajowego*:
1 530 137,68 zł
- Dofinansowanie z *funduszy Unii Europejskiej*:
23 312 029,81 zł
- Dofinansowanie z *DSDiK (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei)*:
826 481,33 zł
- Dofinansowania uzyskane z *Budżetu Państwa*:
27 612 287,14 zł
- Dofinansowanie z *prywatnych funduszy*:
118 827,84 zł

Procentowy udział poszczególnych źródeł do całości otrzymanych dofinansowań w latach 2015-2017:

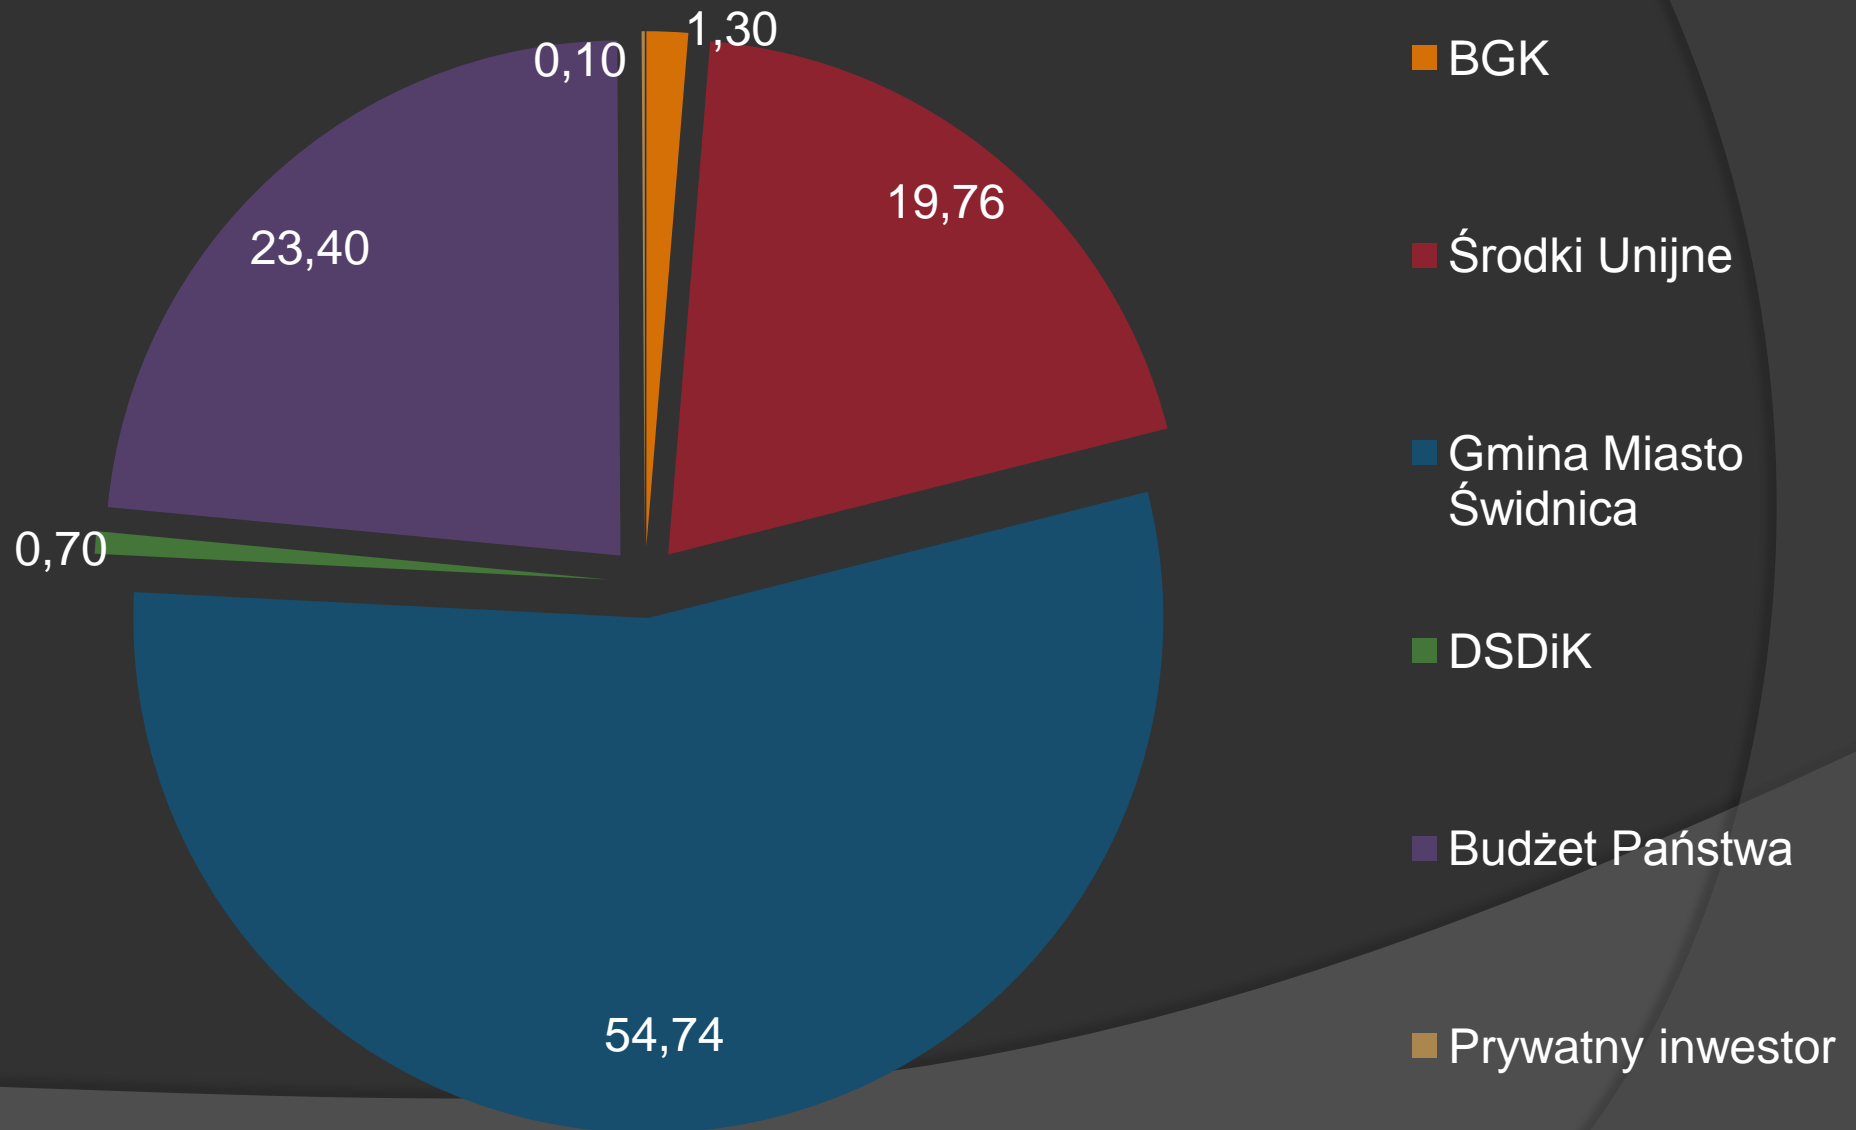



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
