


**SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTO ŚWIDNICA
NA LATA 2015-2024
STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

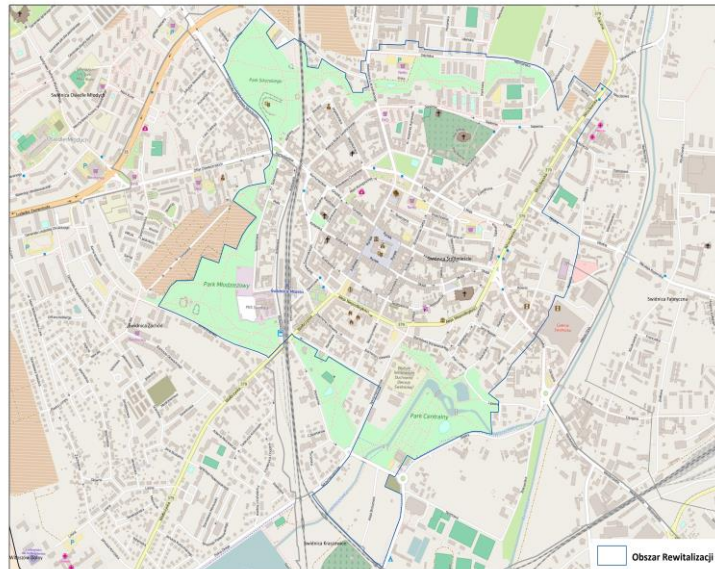

**WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIDNICY**

www.um.swidnica.pl

Luty 2021 r.

Niniejsze sprawozdanie końcowo - roczne za rok 2020 jest podstawowym narzędziem służącym monitorowaniu stopnia realizacji projektów i przedsięwzięć przyjętych przez Radę Miejską w Świdnicy w „**Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024**”, a realizowanych w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020” Ministra Rozwoju oraz wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD), a w szczególności Oś priorytetową 6 Infrastruktura spójności społecznej.

Zgodnie z zapisem Rozdziału 7: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji, Działu: Monitoring i ewaluacja, **Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024 (LPR)**, Gmina Miasto Świdnica jest zobowiązana do ciągłego i systematycznego procesu zbierania i analizowania danych ilościowych i jakościowych, który umożliwia opisanie aktualnego stanu realizacji LPR. Proces ten polega na bieżącej obserwacji postępu finansowo-rzeczowego projektów rewitalizacyjnych, która pozwala ocenić stan zaawansowania realizacji ww. przedsięwzięć oraz stwierdzić czy są realizowane zgodnie z założeniami, jakie zostały przyjęte na etapie ich planowania. Celem monitorowania jest więc określenie postępu rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz zapewnienie zgodności ich realizacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, a w szczególności projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w załączniku nr 1 (Lista A) i załączniku nr 2 (Lista B).

REWITALIZACJA (def.) – stanowi proces **wyprowadzenia ze stanu kryzysowego** obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób **kompleksowy** poprzez **zintegrowane działania** na rzecz **lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie**, prowadzone przez **interesariuszy rewitalizacji** na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

LPR – jest mapą drogową dla całego obszaru rewitalizacji, pokazującą jak w perspektywie kilku lat rozwiązywane są problemy obszaru i społeczności lokalnej.

WYKAZ UCHWAŁ:

1. Uchwała nr X/91/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica;
2. Uchwała nr XIX/203/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica;
3. Uchwała nr XXI/217/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024”;
4. Uchwała nr XXXI/331/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024”;
5. Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024”.

WIZJA

Obszar rewitalizacji stanie się miejscem inteligentnego rozwoju łączącego tradycję z nowoczesnością. Aktywni mieszkańcy, wspólnie z lokalnymi władzami, uwzględniając miejscową tradycję, będą wzmacniać istniejące oraz kreować nowe kierunki rozwoju obszaru, sprzyjające włączeniu społecznemu. Trwały rozwój oparty na współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności lokalnej społeczności odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁANIA

Potrzeby rewitalizacyjne Gminy Miasto Świdnica zostały zdiagnozowane na podstawie analizy mierników rozwoju, warsztatów problemowych z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz badania ankietowego mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Cel 1. *Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją poprzez działania w zakresie integracji i włączenia społecznego.*

Kierunek działań:

- Integracja i aktywizacja społeczna obszaru objętego rewitalizacją;
- Podniesienie jakości edukacji oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Cel 2. *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia jej użyteczności dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego.*

Kierunek działań:

- Poprawa jakości przestrzeni obszaru rewitalizowanego;
- Poprawa stanu infrastruktury społecznej obszaru rewitalizowanego;
- Poprawa stanu środowiska obszaru rewitalizowanego;
- Poprawa dostępności i bezpieczeństwa komunikacyjnego obszaru rewitalizowanego.

Cel 3. *Wsparcie dla rozwoju gospodarczego w celu poprawy oferty obszaru oraz zmniejszenia zjawiska bezrobocia i ubóstwa.*

Kierunek działań:

- Rozwój oferty wspierającej firmy z obszaru rewitalizowanego.

Źródła finansowania projektów:

- budżet Unii Europejskiej;
- budżet jednostek/ podmiotu odpowiedzialnych za dany projekt;
- koszty utrzymania inwestycji po zakończeniu projektu pokrywane ze środków własnych beneficjentów.

OBSZAR REWITALIZACJI:

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, rewitalizacją objęto **część śródmieścia** Świdnicy. Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię **2,4 km²** (11% powierzchni gminy), który na dzień

analizy obszaru zamieszkiwało **17.276 osób** (29,92% mieszkańców). Procesem rewitalizacji objęto łącznie **82 ulice** zlokalizowane w ścisłym centrum miasta wraz z przyległymi parkami i terenami zielonymi tj.: 1 Maja, 8 Maja, Al. Brzozowa, Al. Niepodległości, Basztowa, Boczna, Bohaterów Getta, Bolesława Chrobrego, Bracka, Budowlana, Daleka, Długa, Dworcowa, Folwarczna, Franciszkańska, Garbarska, Gdyńska, Grodzka, Hetmańska, Jagiellońska, Joachima Lelewela, Kazimierza Pułaskiego, Klasztorna, Kolejowa, Komunardów, Kościelna, Kotlarska, Kręta, Księcia Bolka Świdnickiego, Księżnej Agnieszki, Kwiatowa, Lipowa, Łukowa, Mała, Marii Konopnickiej, Jana Matejki, Mennicka, Muzealna, Nauczycielska, Pańska, Parkowa, Piekarska, Pionierów, Pl. 1000-Lecia Państwa, Pl. Grunwaldzki, Pl. Kombatantów, Pl. Ludowy, Pl. Michała Drzymały, Pl. Pokoju, Pl. Św. Jana Pawła II, Pl. Św. Małgorzaty, Pl. Wojska Polskiego, Pl. Wolności, Podchorążych, Przechodnia, Romualda Traugutta, Równa, Różana, Rynek, Rzeźnicza, Saperów, Sienna, Siostrzana, Spacerowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców, Stanisława Wyspiańskiego, Stawki, Stefana Żeromskiego, Szpitalna, Środkowa, Świętokrzyska, Teatralna, Trybunalska, Waleriana Łukasińskiego, Wałbrzyska, Wałowa, Westerplatte, Wewnętrzna, Wrocławska, Zamkowa, Zygmuntowska.

Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego opracowywany jest w oparciu o dane i informacje przekazywane m.in. przez podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacyjne i zawiera następujące informacje w zakresie realizowanych przez siebie projektów:

a) Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych odpowiednio:

- Stan zaawansowania przygotowania/ realizacji projektu.

b) Dla projektów zakończonych:

- Osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu (jeśli dotyczy: uzasadnienie nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników dla projektu, określonych w LPR),
- Istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego zawiera co najmniej:

a) Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR (narastająco), sporządzoną w oparciu o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty rewitalizacyjne.

b) Rekomendacje odnośnie:

- Konieczności/braku konieczności ponowienia naboru projektów rewitalizacyjnych w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do LPR, w następstwie m.in. oceny,
- Konieczności/braku konieczności wykreślenia projektów rewitalizacyjnych umieszczonych w LPR, w następstwie m.in. przeprowadzenia analizy.

Opóźnienie terminu realizacji projektu, wystąpienie istotnych ryzyk i zagrożeń realizacji projektu czy też zmniejszenie docelowej wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowić może przesłankę do wykreślenia projektu z LPR.

Indykatywne ramy finansowe realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica wynikają ze zgłoszonych i zaakceptowanych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Projekty/przedsięwzięcia zostały zgłoszone przez interesariuszy rewitalizacji w procedurze otwartego naboru z wykorzystaniem ankiety projektu rewitalizacyjnego. Przyjęta przez Gminę Miasto Świdnica procedura naboru była przejrzysta, powszechnie dostępna i niedyskryminująca. W związku z przyjętą metodologią uspołecznienia procesu przygotowania LPR, po zakończeniu naboru, lista projektów/przedsięwzięć została przekazana Zespołowi ds. Rewitalizacji i była przedmiotem dyskusji w trakcie warsztatów. W dalszej kolejności zgłoszone przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne zostały poddane analizie ze względu na ich kwalifikowalność do realizacji. Brano pod uwagę realizację celów LPR, skalę oddziaływania na obszar rewitalizacji oraz harmonogram wdrażania. Na tej podstawie opracowano listę A i B przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych. Lista A odnosi się do działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014 -2020. Lista B zawiera pozostałe kwalifikujące się przedsięwzięcia/projekty. Lista A i lista B przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych stanowią załącznik nr 1 i 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica. Podsumowanie wartości zgłoszonych projektów tworzy indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji. Przyjęta do realizacji w roku 2016 lista A i lista B, w roku 2017 i 2019 została zaktualizowana (dodano nowe projekty, usunięto lub przesunięto projekty między listami).

W oparciu o dane i informacje przekazane przez podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacyjne oraz na podstawie ogłoszeń i wyników przeprowadzonych naborów wniosków aplikacyjnych, stwierdzono, iż w analizowanym okresie sprawozdawczym, tj. do 31.12.2020r., realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica obejmującego lata 2015-2024, kształtuje się następująco:

LISTA A

Na **Liście A** aktualizowanej w roku 2019 znajduje się **69** projektów, w tym:

- **52** projekty wspólnot mieszkaniowych (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 64);
- **12** projektów Gminy Miasto Świdnica (poz. 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,66,69);
- **2** projekty Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (poz. 46, 67);
- **1** projekt Caritas Diecezji Świdnickiej przy ul. Westerplatte 4-6 (poz. 54);
- **1** projekt Starostwa Powiatowego w Świdnicy (poz. 65);
- **1** projekt Lokalnej Organizacji Turystycznej (poz. 68).

L.P.	NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	STATUS	OKRES REALIZACJI	WARTOŚĆ ZADANIA (PLN)	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ODNIESIENIE DO WSKAŹNIKÓW
LISTA A						
1.	Remont elewacji frontowej wraz dociepleniem pozostałych ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 13 w Świdnicy.	zrealizowany częściowo	2018	64.061,92	środki własne	1 obiekt wyremontowany
2.	Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Księcia Bolka 15 w Świdnicy.	zrealizowany	2018-2019	482.288,29, w tym dofinansowanie 200.000,00	środki własne+ 200.000,00 dotacja z GMŚ	1 obiekt wyremontowany
3.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Drzymały 11 w Świdnicy.	zrealizowany	2019	68.451,73	środki własne	1 obiekt wyremontowany
4.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Księżnej Agnieszki 1 i Placu Św. Małgorzaty 6 w Świdnicy.	zrealizowany	2018-2019	319.757,98, w tym dofinansowanie 151.764,71	RPO WD 2014-2020 i środki własne	1 obiekt wyremontowany
5.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Rynek 1 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
6.	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 4-4a w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
7.	Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 12 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
8.	Remont elewacji oraz remont klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 14-14a w Świdnicy.	zrealizowany częściowo	2020	18.668,22	środki własne	1 obiekt wyremontowany
9.	Remont elewacji budynku oraz klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grodzkiej 5 w Świdnicy.	zrealizowany	2019	148.476,70, w tym dofinansowanie 70.318,57	środki własne i dotacja GMŚ	1 obiekt wyremontowany
10.	Remont elewacji z dociepleniem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Budowlanej 4	zrealizowany	2018 - 2019	117.173,11, w tym dofinansowanie	środki własne i dotacja GMŚ	1 budynek zmodernizowano

	w Świdnicy.			61.000,00		energetycznie
11.	Odnowienie i ocieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 29 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
12.	Remont elewacji i klatki schodowej wraz z wymianą instalacją gazową w budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego nr 17 w Świdnicy.	częściowo zrealizowany	2018	10.325,00	środki własne	1 budynek wyremontowany (bez remontu elewacji)
13.	Remont elewacji i klatki schodowej budynku przy ul. Jagiellońskiej nr 9 w Świdnicy.	zrealizowany	2018-2019	199.416,00, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 128.616,24	RPO WD 2014-2020, Budżet Państwa i środki własne	1 obiekt wyremontowany
14.	Remont elewacji i dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej nr 11 w Świdnicy.	w trakcie realizacji	X	X	X	X
15.	Remont elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej nr 6 w Świdnicy.	zrealizowany	2019	195.391,82, w tym dofinansowanie 97.812,00	środki własne i dotacja z GMS	1 obiekt wyremontowany
16.	Remont elewacji tylnej wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Rynek 24 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
17.	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Trybunalskiej nr 23 w Świdnicy.	w trakcie realizacji	X	X	X	X
18.	Remont elewacji i klatki schodowej budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 57 w Świdnicy.	w trakcie realizacji	X	X	X	X
19.	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Joachima Lelewela 24 w Świdnicy.	w trakcie realizacji	X	153.776,26, w tym dofinansowanie 113.794,43	RPO WD 2014-2020, Budżet Państwa i środki własne	X
20.	Odnowienie i ocieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego-Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Traugutta 1.	częściowo zrealizowany	2019	39.179,00	środki własne	10 gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii
21.	Remont elewacji frontowej budynku wraz	w trakcie	x	X	X	X

	z remontem klatek schodowych przy ul. Komunardów 6-6a-6b w Świdnicy.	realizacji				
22.	Remont elewacji i klatki schodowej wraz z wymianą instalacji technicznych w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 51 w Świdnicy.	zrealizowany	2019	76.731,81	środki własne	1 obiekt wyremontowany
23.	Modernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Komunardów 14 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
24.	Ocieplenie budynku ul. Pułaskiego 20-22 w Świdnicy.	zrealizowane	2016 – 2019	159.000,00	środki własne	700 m ² powierzchnia budynku poddana termomodernizacji
25.	Odnowienie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeromskiego 11-13-13a.	częściowo zrealizowany	2019	245.659,00	środki własne/kredyt	1 obiekt częściowo wyremontowany
26.	Modernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowa 3.	zrealizowane	2018-2019	160.894,00	środki własne/kredyt	1 budynek zmodernizowano energetycznie
27.	Odnowienie i ocieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 9.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
28.	Odnowienie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzka 4.	zrealizowany	2018 - 2019	221.218,33, w tym dofinansowanie 132.000,00	środki własne i dotacja GMS	1 zabytek nieruchomy objęty wsparciem
29.	Odnowienie i ocieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 38.	częściowo zrealizowany	2018	93.000,00, w tym dofinansowanie 20.000,00	środki własne/kredyt i dotacja GMS	1 budynek częściowo zmodernizowano energetycznie
30.	Odnowienie i ocieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej	nie-zrealizowany	X	X	X	X

	40.					
31.	Odnowienie i ocieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 42.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
32.	Odnowienie i ocieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trybunalska 8.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
33.	Odnowienie i ocieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynek 22.	częściowo zrealizowany	2018	42.736,08, w tym dofinansowanie 21.300,00	środki własne i dotacja GMŚ	1 obiekt częściowo wyremontowany
34.	Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. K. Pułaskiego 1-5 w Świdnicy.	zrealizowany	2016-2018	164.711,00	środki własne	1 budynek zrewitalizowany
35.	Rewitalizacja budynku przy ul. Nauczycielskiej 1 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
36.	Remont kapitalny dachu dachówkowego wraz z rynnami i rurami spustowymi , docieplenie elewacji frontowej budynku wraz z kolorystyką Sienna 11.	zrealizowany	2018	76.002, 83	środki własne/ kredyt	300 m powierzchni użytkowej dachu
37.	Odnowienie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego -Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońska 18.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
38.	Odnowienie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońska 16.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
39.	Remont elewacji budynku wraz z ociepleniem przy ul. Wyspiańskiego 2A.	zrealizowany	2018	57.570,78	środki własne/kredyt	1 budynek zrewitalizowany
40.	Prace remontowe - zabezpieczające budynki przy Pl. Drzymały i ul. Westerplatte 10.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
41.	Prace remontowe zabezpieczające budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
42.	Remont budynku przy ul. Długiej 26	nie-	X	X	X	X

	w Świdnicy.	zrealizowany				
43.	Remont kamienicy przy ul. Bocznej 6 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
44.	Remont budynku przy ul. Kotlarskiej 14 w Świdnicy.	Zrealizowany częściowo	2019-2020	151.631,11	Środki własne i kredyt	½ budynku rewitalizowana
45.	Remont części wspólnych kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Wałowej 4 w Świdnicy.	zrealizowany częściowo (bez elewacji)	2019	38 350,00	środki własne	½ budynku rewitalizowana
46.	Remont wraz z termomodernizacją budynku galeriowego przy ul. Siostrzanej 1-25, 7a w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
47.	Remont budynku przy ul. Łukasińskiego 13 w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
48.	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy pl. Grunwaldzkim 4	zrealizowany	2018	459.620,00, w tym dotacja 212.000,00	środki własne/ kredyt i dotacja z GMS	1 budynek zrewitalizowany
49.	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby młodzieży i seniorów.	nie-zrealizowany	X	X	X	X
50.	Wykonanie remontu budynków wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Grodzkiej 1; ul. Bolesława Chrobrego 5; ul. Bolesława Chrobrego; ul. Budowlanej 2 w Świdnicy.	zrealizowany częściowo w zakresie Budowlanej 2 i ul. Bolesława Chrobrego 8	2018 – 2020	Ul. Budowlana 2 295.118,60, w tym dofinansowanie 147.500,00 ul. B. Chrobrego – 77.000,00	Ul. Budowlana 2 - środki własne i dotacja z GMS, ul. B. Chrobrego – środki własne	2 budynek zrewitalizowany
51.	Wykonanie remontu budynków wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Waleriana Łukasińskiego 14; ul. Długiej 19-19A; ul. Kazimierza Pułaskiego 48; pl. Grunwaldzki 3-3A w Świdnicy.	zrealizowany częściowo	2018 - 2019	88.949,71, w tym dofinansowanie 45.500,00	środki własne i dotacja GMS	1 budynek zrewitalizowany przy ul. Łukasińskiego 14, opracowano dokumentację budynku ul. Długa 19

52.	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3A; ul. Pierwszego Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy.	zrealizowany	2019-2020	2.951.556,24, w tym dofinansowanie 1.973.134,44	RPO WD 2014-2020 i środki GMS	5 budynków objętych rewitalizacją
53.	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy.	zrealizowany	2019-2020	2.946.340,06, w tym dofinansowanie 1.529.216,49	RPO WD 2014-2020 i środki GMS	6 budynków objętych rewitalizacją
54.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne przy centrum Charytatywnym w Świdnicy Caritas Diecezji Świdnickiej.	zrealizowany	2019 – 2020	431.599,00, w tym dofinansowanie 366.859,15	RPO WD 2014-2020 i środki własne Caritas Diecezji Świdnickiej	230 m przebudowy przestrzeni publicznej
55.	Odnowienie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. 1000-lecia 4.	zrealizowany	2017	201.577,14	środki własne/kredyt	1 budynek wyremontowano
56.	Odnowienie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Św. Małgorzaty 4.	nie- zrealizowany	X	X	X	X
57.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.	zrealizowany	2018 2020	patrz poz. 59	RPO WD 2014-2020 i środki GMS	180 m dł. przebudowanej drogi gminnej
58.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa basenu OSiR przy ul. Równej w Świdnicy.	nie- zrealizowany	X	X	X	X
59.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa budynku Rynek 39/40 w Świdnicy.	zrealizowany	2018- 2020	(połączono zadania z listy A - 57, 59, 61, 65, 67, 68) 10.632.374,94, w tym dofinansowanie 6.437.528,66.	RPO WD 2014-2020 i środki GMS	1 obiekt infrastrukturalny zlokalizowany na obszarze rewitalizowanym
60.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartału	nie- zrealizowany	X	X	wniosek złożony do RPO WD – nie	X

	ul. Grodzka – Kotlarska.					otrzymał dofinansowania. Wniosek złożony do NFOŚiGW w MF EOG oraz NMF 2014-2021.	
61.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek.	zrealizowany	2018-2020	patrz poz. 59		RPO WD 2014-2020 i środki GMŚ.	0,4682 ha powierzchni obszarów objętych rewitalizacją
62.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartału ul. Konopnicka – Franciszkańska.	nie-zrealizowany	X	X		Wniosek złożony do RPO WD – nie otrzymał dofinansowania. Wniosek złożony do NFOŚiGW w MF EOG oraz NMF 2014-2021	X
63.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X		X	X
64.	Renowacja elewacji frontowej oraz dokończenie remontu elewacji od strony podwórza. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 53 w Świdnicy.	zrealizowany częściowo	2016-2019	35.260,80, w tym dotacja z GMŚ 3.000,00		środki własne/kredyt i dotacja GMŚ	1 obiekt zrewitalizowany - remont elewacji od strony podwórka i dokumentacja techniczna
65.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - wyposażenie sali Rynek 39 - 40 w Świdnicy na potrzeby aktywizacji społecznej i promocji regionu.	zrealizowany	2018 - 2020	patrz poz. 59		RPO WD 2014-2020 i środki GMŚ i Starostwo Powiatowe	1 obiekt infrastrukturalny wsparty na obszarze rewitalizowanym
66.	Klub Młodzieżowy - wypoczynek - praca – zabawa. (66A)	częściowo zrealizowany	2020	X		środki własne	przysposobiono powierzchnie w Rynku 39/40
67.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - wyposażenie pomieszczenia budynku śródmiejskiego w Świdnicy na potrzeby społeczne.	zrealizowane	2018-2020	patrz poz. 59		projekt zrealizowany w partnerstwie bez udziału Spółdzielni	wyposażono salę konferencyjną na realizację działań

					Mieszkaniowej w Świdnicy	społecznych
68.	Rewitalizacja Miasta Świdnicy-Rynek- Wyposażenie Informacji Turystycznej.	zrealizowany	2018-2020	patrz poz. 59	RPO WD 2014-2020 i środki GMS	1 obiekt infrastrukturalny wsparty na obszarze rewitalizowanym
69.	Rewitalizacja teatru miejskiego w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	X	X

Na **69** projektów umieszczonych na **liście A**:

- **25** projekty zostały zrealizowane z sukcesem,
- **13** projektów zostało zrealizowanych częściowo,
- **5** projektów jest w trakcie realizacji.

W przypadku **43** projektów z listy A wnioskodawcy zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji wykazali inicjatywę i przystąpili do realizacji zadań.

W przypadku **26** projektów z listy A wnioskodawcy zadań podejmowali działania – składali wnioski o środki zewnętrzne, bądź nie mieli możliwości finansowych pozwalających im na rozpoczęcie działań ze środków własnych. W większości były to wspólnoty mieszkaniowe, które oczekiwały wsparcia zewnętrznego, gdyż nie dysponowały wystarczającym budżetem na prowadzenie prac remontowych.

LISTA B

Na **Liście B** zaktualizowanej roku 2019 znajduje się **35** projekty, w tym:

- **20** projektów Gminy Miasto Świdnica (poz. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 i 35);
- **4** projekty Diecezji Świdnickiej (poz. 30, 32, 33, 34);
- **1** projekt Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Stanisława i Św. Wacława (poz. 31);
- **1** projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Traugutta 5 w Świdnicy (poz. 28);
- **3** projekty Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem (poz. 8,22,26);
- **1** projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy (poz. 14);
- **1** projekt Fundacji „Next Generation” (poz. 10);
- **1** projekt Straży Miejskiej w Świdnicy (poz. 9);
- **1** projekt Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy (poz. 6);

- 1 projekt Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (poz. 5);
- 1 projekt Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (poz. 3).

L.P.	NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	STATUS	OKRES REALI- ZACJI	WARTOŚĆ ZADANIA (PLN)	ŹRÓDŁA FINANSO- WANIA	KRÓTKI OPIS EFEKTÓW RZECZOWYCH
LISTA B						
1.	Rewitalizacja i adaptacja na cele turystyczne i kulturalne zespołu fortyfikacyjnego twierdzy Fryderyka Wielkiego w Świdnicy.	nie-zrealizowany	X	X	brak środków na realizację	X
2.	Świdnica 2026 - Rozwój i promocja przedsięwzięć o znaczeniu turystyczno-kulturalnym.	zrealizowany częściowo	2018-2020x	X	realizacja w ramach środków własnych	1.Organizacja Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy oraz debaty w kolejnych latach. 2.Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i realizacja zadań zleconych w otwartych konkursach ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa na zadania: „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” oraz „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy w latach 2018-2020”. 3.Zadania z zakresu zwiększenia ruchu turystycznego w Świdnicy: -udział Świdnicy w targach turystycznych odbywających się w Polsce i zagranicą; -publikowanie materiałów promocyjnych dotyczących Świdnicy w mediach turystycznych oraz w programach telewizyjnych i radiowych, dystrybucja i zapraszanie do odwiedzania Świdnicy aktywnie działających PTTK-ów i krajowych biur podróży poprzez

					<p>dystrybucję do nich oferty turystycznej Świdnicy;</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowywanie i wydawanie cennych kolekcji turystycznych – m.in. popularnej w całej Europie kolekcji znaczków turystycznych, kolekcji monet, kart pocztowych, prezentacja oferty Świdnicy na spotkaniach z touroperatorami z Polski, Czech, Niemiec, Brazylii i USA; - udział Świdnicy w organizacjach turystycznych opracowujących produkty turystyczne regionu oraz wspierających się promocyjnie (współpraca m.in. z Osówką, Zamkiem Książ, Grodno, DOT, LOT AW itp., Fundacją „Niesamowity Dolny Śląsk”). <p>Efektom społecznym, tych działań było zwiększenie rozpoznawalności Świdnicy, jako obszaru ruchu turystycznego na mapie Polski, Europy i świata, zwiększenie liczby osób korzystających z noclegu i usług gastronomicznych Świdnicy, co przekłada się na miejsca pracy i wzrost przychodów przedsiębiorstw turystycznych i paraturystycznych.</p> <p>4.Zadania z zakresu promocji turystycznej Świdnicy w Polsce i poza jej granicami, zwiększenie obecności Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i zagranicznych – organizowanych indywidualnie</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>i grupowo, wzbudzanie zainteresowania Świdnicą wśród turystów kulturowych, promocja turystyczna Świdnicy w mediach tradycyjnych i elektronicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> -organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli mediów turystycznych i blogerów w Świdnicy (weekendowe spotkanie podczas, których zapoznujemy gości z ofertą turystyczno-kulinarną Świdnicy). <p>Efektom społecznym, tych działań był: wzrost konkurencyjności gospodarki turystycznej na rynku regionalnym, poprawa atrakcyjności turystycznej Świdnicy, poprawa wizerunku miasta, jako obszaru recepcji turystycznej, rozwój współpracy regionalnej w zakresie turystyki, wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców (noclegi, wyżywienie).</p> <p>5.Współpraca z pilotami wycieczek i organizatorami biur podróży z Polski i z zagranicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -promocja turystyczna Świdnicy w Polsce i poza jej granicami, -zwiększenie obecności Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i zagranicznych – organizowanych indywidualnie i grupowo, -wzbudzanie zainteresowania Świdnicą
--	--	--	--	--	--

						<p>wśród turystów, -promocja turystyczna w mediach tradycyjnych i elektronicznych, -kompleksowa organizacja przez Miasto wizyt studyjnych dla przewodników, pilotów wycieczek oraz organizatorów turystycznych, pilotów wycieczek oraz organizatorów turystycznych (przedstawiciele biur podróży, organizacji turystycznych tj.: PTTK i LOT-y z Polski i z zagranicy). Efekt społeczny: większe zaistnienie Świdnicy w świadomości organizatorów wycieczek i pojawienie się miasta jako kierunku eksponowanego w ich ofertach turystycznych, nawiązanie współpracy pomiędzy branżą turystyczną ze Świdnicy i spoza Świdnicy na rzecz rozwoju turystyki w mieście.</p> <p>6. Wykreowanie i promocja lokalnych produktów, w tym m.in. pierników, piwa, wina, majonezu oraz dziczyzny, w tym również poprzez organizacje konkursów i zlotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XIII Targi „Zdrowie ma smak”, - IV Świdnicki Festiwal Piwa, - Święto Dzika, - Pierniki świdnickie.
3.	Przebudowa sieci wodociągowych obejmujących wymianę przyłączy wodociągowych i monitoring dystrybucji wody oraz przebudowa	zrealizowany częściowo	2017-2020	X	środki własne	1.wykonano dokumentację projektowa na przebudowę sieci w ul. Długiej, Rynku oraz wul. Środkowej wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę;

	sieci kanalizacyjnych w obszarze miasta Świdnicy.					2.wykonano przy realizacji przebudowy sieci w ul. Saperów tylko węzeł połączeniowy DN225 PE z siecią wodociągową w ul. Kościelnej. 2. wykonano 100% wymiany sieci wodociągowej przy ul. Trybunalskiej oraz wymieniono sieć wodociągową w ul. Nauczycielskiej na odcinku od ul. R. Traugutt do ul. J. Lelewela.
4.	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego 26.	zrealizowany	2018-2019	3.905.331,16 w tym dofinansowanie 2.513.385,37	RPO WD 2014-2020 oraz środki GMS	1161 m ² powierzchni użytkowej budynków poddano termomodernizacji.
5.	Świdnicka Liga Młodych Mistrzów.	zrealizowany pn. „Každy jest ważny – programy rozwojowe świdnickich szkół” oraz w realizacji pn. „Świdnicka Mozaika Edukacyjna” i „Mozaika edukacyjna”	2017-2020	1.588.896,00 w tym dofinansowanie dla Świdnicy 1.097.000,00 oraz 1.761.242,88 w tym dofinansowanie dla Świdnicy 838.121,44 i 1.521.283,72 w tym dofinansowanie dla Świdnicy 411.462,40	RPO WD 2014-2020 oraz środki GMS	W ramach zadania realizowane były projekty: 1.„ Každy jest ważny -programy rozwojowe świdnickich szkół ” - celem projektu jest zapewnienie uczniom 5 świdnickich szkół: SP nr 6; SP nr 315; Gimnazjum nr 2, 3, 4 rozwijanie kompetencji kluczowych. W realizacji są dwa projekty: 2. „ Świdnicka mozaika edukacyjna ” – w projekcie uczestniczy 7 świdnickich szkół podstawowych, w których do końca sierpnia 2020 r. nastąpi wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 1420 uczniów poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, prowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizację różnych kompleksowych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, narzędzi TIK oraz wyposażonych w ramach projektu pracowni matematyczno-

						<p>przyrodniczych oraz TIK.</p> <p>3. „Mozaika edukacyjna” projekt skierowany do nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz uczniów 5 szkół podstawowych, w tym 3 szkół ze Świdnicy (SP1, SP4, SP8).</p>
6.	Termomodernizacja budynku A oraz budynku portierni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy oraz Remontu, docieplenia i zmiany kolorystki elewacji budynku B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.	w trakcie realizacji	2020-2021	1.833.649,30 w tym dofinansowanie 1.540.751,90	PO IŚ i środki własne	<p>Przedmiotem prac jest modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej położonej przy Alei Niepodległości 8-10 w Świdnicy. Prace termomodernizacyjne budynek A: docieplenie ścian, docieplenie stropów i dachów, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne. Prace termomodernizacyjne budynek B: docieplenie ścian, w tym między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, docieplenie stropodachów i dachów, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne.</p>
7.	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej. (Program KAWKA II).	zrealizowany	2016-2018	18.185.717,09 w tym dofinansowanie 7.122.000,00 i pożyczka 3.561.000,00	NFOŚiGW i środki własne	<p>W ramach zadania na ulicach: Wrocławskiej, Wodnej, Jodłowej, Dębowej, Kazimierza Pułaskiego, Franciszkańskiej, Grodzkiej , Of. Oświęcimskich, Gen. Władysława Sikorskiego, Siennej, Kościelnej, Hugo Kołłątaja, Juliusza Słowackiego, 1-go Maja, Siostrzanej, Teatralnej, Mieszka I, Parkowej, Saperów, Przechodniej, Rynek podłączono do sieci ciepłowniczej w roku 2018 - 338 mieszkań wraz z likwidacją 501 palenisk węglowych. Łącznie podłączono 554 lokale mieszkalne w 88 budynkach i zlikwidowano 762 piece.</p>

8.	Klub Aktywności Rozmaitej.	nie-zrealizowany	X	X	brak środków na realizację	X
9.	Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Świdnicy.	realizowany częściowo	2016-2020	3.000,00	realizacja w ramach środków własnych	Działaniami projektowymi objęto szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Pracownicy Straży Miejskiej pod hasłem „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji zdrowotnych i prawnych wynikających z szeroko rozumianych uzależnień” prowadzą spotkania. W roku 2018 prowadzili 21, a w roku 2019 – 29 spotkań i zajęć dotyczących szeroko rozumianych uzależnień prowadzonych w szkołach lub siedzibie Straży Miejskiej. Opracowano i wydano 2.500 szt. broszur profilaktyczno- edukacyjnych pt. „Inspektor Janosik ostrzeża”- z ostrzegających związanych ze spożywaniem alkoholu oraz niebezpiecznymi skutkami nadużywania alkoholu. Podejmowano działania kontrolno-interwencyjne w środowisku, głównie osób bezdomnych z oferta pomocową: zakwaterowanie, wyżywienie terapia.
10.	Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na usługi przedszkolne.	nie-zrealizowany	X	X	brak środków na realizację	X
11.	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Miasto Świdnica poprzez budowę infrastruktury rowerowej.	zrealizowany	2017-2019	8.017.428,58 w tym dofinansowanie 6.687.451,30	RPO WD 2014-2020 i środki GMS	Zrealizowany projekt pn. „Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” polegający na rozbudowie sieci dróg rowerowych w Świdnicy, obejmujący zakres prac:

						<ul style="list-style-type: none"> • Budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika; • Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy; • Budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy; • Budowę ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy; • Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy; • Budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej w Świdnicy. <p>Projekt dodatkowy pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” obejmujący swoim zakresem nw. prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem; • budowę drogi pieszo – rowerowej na terenie Gminy Świdnica w miejscowości Bystrzyca Dolna; • budowę ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo – rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy; • działania promocyjne o wartości całkowitej dla Świdnicy 3.965.905,64 zł, w tym dofinansowanie 2.857.817,99 zł.
12.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej.	zrealizowany	2018-2019	5.126.804,84 w tym dofinansowanie 2.584.800,00	Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz	Realizacja projektu pn. „Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy” polegało na przebudowie drogi gminnej nr 112000D

					Konkurencyjn ości Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	o łącznej długości 999,90 m oraz ścieżek pieszo-rowerową długości 1 km, 2 zatok autobusowych, 2 przystanków autobusowych. Wybudowano sieci kanalizacji deszczowej w skład, której wchodzi studnie betonowe włączowe Ø1200, kanały o średnicy Ø200- Ø800 z rur PP SN8, wylot kanalizacji do potoku Jabłoniec, oraz wpusty uliczne ściekowe o średnicy Ø500 mm. Wybudowano linię kablową niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0.4 kV i oświetlenia drogowego wraz z słupami aluminiowymi.
13.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Świdnica dla obszarów nie objętych zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej.	zrealizowany	2019-2020	X	Realizacja w ramach zadania poz. 15 z listy B	Projekt w części realizowany w projekcie grantowy „Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Miasto Świdnica w ramach projektu prosumenckiego gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
14.	Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi komunikacji miejskiej w Świdnicy.	zrealizowany	2018-2019	10.442.725,83 w tym dofinansowanie 7.216.517,85	RPO WD 2014-2020 i środki własne MPK sp. z o.o.	Zrealizowano projekt pn. „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica i gmin Świdnica i Marcinowice” w ramach, którego zakupiono 9 sztuk nowoczesnych i ekologicznych autobusów do obsługi pasażerów korzystających z linii miejskich i podmiejskich.
15.	Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Miasto Świdnica w ramach projektu prosumenckiego gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	w realizacji (projekt partnerski)	2019-2022	24.212.601,37 w tym dofinansowanie 16.840.999,95	RPO WD 2014-2020 i środki własne	Projekt w realizacji pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych

						w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt partnerski grantowy i polegać będzie na udzielaniu grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Realizacja nastąpi w latach 2020-2022.
16.	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy.	zrealizowany	2016-2019	23.105.056,55 w tym dofinansowanie 14.245.496,09	PO IiŚ i środki własne	Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy obejmowała: 1) Rewaloryzację parku Centralnego; 2) Rewaloryzację parku Gen. Władysława Sikorskiego; 3) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP – inwestycja oddana do użytku; Projekt w 2019 r. rozszerzono o kolejny element: Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy.
17.	Świdnicki inkubator wspomagania osób zaburzonych psychicznie.	zrealizowany częściowo – w ramach zadania podjęto działania profilaktyczne pn. Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami i rozwoju i	2017-2020	53.770,00 w tym dofinansowanie 34.090,00 oraz 6.440,00	środki własne i MRPiPS	MOPS w Świdnicy podjął działania profilaktyczne w ograniczony zakresie w ramach projektu „Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego”. Działaniami wsparto ponad 50 rodzin w zakresie występujących trudności psychicznych u dzieci oraz młodzieży w wieku dorastania. Zapewniono dorosłym i dzieciom m.in. 210 godzin konsultacji takich specjalistów jak: psychiatra dziecięcy, psycholog, terapeuta rodzinny i uzależnień oraz 45 godzin

		zdrowia psychicznego			<p>warsztatów grupowych dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. W okresie od V do XII 2017 r. realizowane były działania edukacyjne dla rodziców na terenie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W latach 2017-18 na zlecenie MOPS prowadzona była grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. Celem prowadzenia grupy było wzmocnienie emocjonalne uczestników, nauka radzenia sobie w życiu z chorobą i jej kryzysami. Spotkania prowadzili doświadczeni terapeuci, z wykształceniem psychologicznym i pedagogicznym. Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ul. Franciszkańskiej 7, 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. W 2017 r. zrealizowano 43 spotkania (łącznie 86 godzin), w których uczestniczyło do 7 osób. Wydatkowano środki w wysokości 5.160 zł. W 2018 r. zrealizowano 37 spotkań (łącznie 74 godziny), w których uczestniczyło do 7 osób.</p> <p>W roku 2020 działała grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich, o charakterze otwartym, po wcześniejszej konsultacji z terapeutą, przeznaczona dla osób cierpiących na depresję, zaburzenia psychiczne lub inne dolegliwości emocjonalne utrudniające funkcjonowanie w życiu społecznym lub osobistym oraz dla ich rodzin i bliskich. Celem prowadzenia grupy było wzmocnienie emocjonalne uczestników, nauka radzenia sobie w życiu z chorobą i jej kryzysami.</p>
--	--	-------------------------	--	--	--

						Spotkania prowadził doświadczony terapeuta, z wyksz. psychologicznym i pedagogicznym. Spotkania odbywały się w siedzibie MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7, 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godz. W 2020 r. zrealizowano 27 spotkań po 2 godz., w których uczestniczyło do 5 osób. Z uwagi na sytuację epidemiczną i wprowadzone obostrzenia, dodatkowo w miejsce planowanych 19 spotkań grupy, realizowano 2 godzinne konsultacje indywidualne lub telefoniczne, w celu zapewnienia ciągłości procesu terapeutycznego, z których każdorazowo korzystało do 3 osób. Łącznie: 92 godz., do 5 osób.
18.	Klub Integracji Społecznej.	realizowany częściowo	2018	193.174,17	RPO WD 2014-2020	MOPS w Świdnicy podjął współpracę z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Gminą Wałbrzych oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy realizacji projektu „Nie emigruję – tu zostaję” w ramach RPO WD 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja. W dziesięciu jednostkach organizacyjnych miasta (DDP Senior Wigor, OSiR, MDK, SP1, SP2, SP8, SP105, SP315, MZN i MBP) zostały zorganizowane staże dla 16 mieszkańców miasta Świdnicy tj. dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo bez rejestracji w PUP oraz osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale zdolnych do odbycia stażu i podjęcia zatrudnienia. Podczas 6 miesięcy stażu uczestnicy projektu świadczą pracę – 35-40 godzin tygodniowo. W roku 2020 został złożony wniosek do

						konkursu. Aktywna integracja.
19.	Promocja idei wolontariatu wśród lokalnej społeczności.	zrealizowany częściowo	2017-2020	77.488,00	środki własne i we własnym zakresie	Działąło Świdnickie Centrum Wolontariatu przy Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33. Członkowie Centrum Wolontariatu prowadzili portal społecznościowy facebook (grupy otwarte) w ramach których promują wolontariat w świdnickich organizacjach. Powstał Fanpage'u Świdnickie Centrum Wolontariatu. Zamieszczano tam informacje o organizowanych wydarzeniach, poszukiwaniu wolontariuszy oraz informacje dla wolontariuszy. W ramach działalności w kolejnych latach prowadzona była współpraca ze szkolnymi klubami wolontariatu, koordynowano działania wolontarystyczne, realizowane przez Młodzieżową Radę Miasta oraz współpracowano przy organizacji wydarzeń, m.in. Festiwal Kolorów, Noc Świętojańska, warsztaty dla dzieci dotyczące 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Okiem Młodych, Wigilia dla organizacji pozarządowych, ferie dla dzieci. Przeprowadzono konkursy: „Miejsce przyjazne wolontariuszom”, „Wolontariusz Roku”, „Aktywna organizacja pozarządowa” oraz zorganizowano Galę Wolontariatu podczas której rozdano nagrody. W roku 2020 z uwagi na Covid-19 zadania były realizowane w innej formie i przede wszystkim na wsparciu seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Została zorganizowana akcja „Wolontariatu Kryzysowego”.
20.	Centrum Aktywności Lokalnej.	nie-zrealizowany	X	X	brak środków na realizację	W roku 2020 w połączeniu z zadaniem 18B został złożony wniosek do konkursu. Aktywna integracja. x
21.	Stare i nowe zabawy podwórkowe.	zrealizowany	2016-2020	X	środki własne	Współorganizacja projektu „ Lato na podwórku ” –edycje od I do V prowadzone były przez Fundację Ładne Historie . W ramach projektu, na wybranych podwórkach

						w Świdnicy przez całe wakacje odbywały się bezpłatne animacje i zajęcia edukacyjne różnego rodzaju dla dzieci, prowadzone przez doświadczony zespół pedagogów i animatorów kultury. Działania były prowadzone różnych lokalizacjach miasta, w tym na podwórku w Centrum. Program obejmował: zajęcia profilaktyczne, animacyjne, plastyczne, artystyczne, sensoryczne, sportowe, naukę tańca oraz języka angielskiego. W ramach projektu świdniczaninami razem robią coś dobrego dla dzieci w swoim najbliższym otoczeniu.
22.	Rodzina w działaniu.	nie-zrealizowany	x	X	brak środków na realizację	X
23.	Uwierz we własne siły.	zrealizowany	2017-2019	481.587,50 w tym dofinansowanie 396.627,50	RPO WD 2014-2020 i środki własne	W projekcie udział wzięło 20 osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, zakwalifikowanych do III profilu bezrobotnych i 10 osób dla których ustalono II profil pomocy oraz co najmniej 20 osób z najbliższego otoczenia. Uczestnikami były osoby uzależnione od pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach lub nieodpowiadających potrzebom rynku pracy, które na przestrzeni całego życia doznały wielu porażek, mają niewielkie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
24.	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne.	zrealizowany	2017-2019	2.441.681,08 w tym dofinansowanie 1.659.062,49	RPO WD 2014-2020 i środki własne	Przedmiotem projektu była przebudowa 2 budynków administracyjnych po Straży Miejskiej na wielorodzinne mieszkania socjalne wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania. W wyniku przebudowy gmina uzyskała 11 lokali mieszkalnych o charakterze

						mieszkań socjalnych.
25.	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane.	zrealizowany	2017-2019	3.998.300,31 w tym dofinansowanie 2.623.078,27	RPO WD 2014-2020 i środki własne	Przedmiotem projektu była przebudowa, wyposażenie infrastruktury oraz adaptacja budynku administracyjnego na mieszkania o charakterze wspomaganych (powstało 20 lokali mieszkalnych). Wsparcie powiązane jest z procesem aktywizacji społecznej oraz społeczno-zawodowej, mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
26.	Akcja podwórko.	zrealizowany częściowo	2017-2020	x	w ramach środków własnych	Zadanie realizowane w połączeniu z zadaniem nr 21 pn. „ Lato na podwórku ” na wybranych podwórkach w Świdnicy.
27.	Mieszkania wspierane i chronione dla mieszkańców Świdnicy z obszaru rewitalizowanego.	w trakcie realizacji	2019-2020	2.980.844,62 w tym dofinansowanie 2.828.944,62	RPO WD 2014-2020 i środki własne	Projekt w trakcie realizacji pn. „ Świdnickie Jaskółki ”, którego celem jest zwiększenie w okresie 01.04.2019 - 31.03.2022 r. samodzielności 90 osób, kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej, a tym samym wzrost potencjału umożliwiającego samodzielne utrzymanie, autonomiczne funkcjonowanie oraz łączenie życia osobistego i zawodowego. Kompleksową interwencję w obszarach stworzenia miejsca zamieszkania, świadomości, wiedzy i umiejętności społecznych: 1) uruchomienie mieszkań wspomaganych, w tym treningowych i wspieranych o optymalnym standardzie; 2) uruchomienie i prowadzenie usług opiekuńczych i asystenckich; 3) prowadzenie treningów i wsparcia podnoszącego kompetencje społeczne ukierunkowane na usamodzielnianie; 4) prowadzenie działań towarzyszących,

						w tym z udziałem rodzin; 5) prowadzenie wsparcia specjalistów, dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb i celów. Projekt jest integralną częścią budowanego trwałego systemu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
28.	Renowacja budynku szkoły medycznej przy ul. Traugutta 5 w Świdnicy z termomodernizacją.	zrealizowany częściowo	2020	129.436,87	środki WMWD	Dobór, dostawa i wymiana pieca kondensacyjnego wraz z urządzeniami współdziałającymi i usprawnieniem działania kotłowni i instalacji CO. Wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach i w wybranych pomieszczeniach.
29.	Rewitalizacja Miasta Świdnica - przebudowa, remont i wyposażenie budynku na cele społeczne (ogrzewalnia lub noclegowania)	nie-zrealizowany	X	X	brak środków na realizację	X
30.	Przebudowa kotłowni, modernizacja instalacji ciepłej, termomodernizacja obiektu.	w trakcie realizacji	2019-2020	738.000,00	środki własne	Wykonano instalację na poziomie I pietra kolegium. Wykonano kanały techniczne. Wykonano części instalacji wod.-kan, co, hydraulicznej i elektrycznej, instalację zasilającą oświetlenie pomieszczeń technicznych węzła wodnego i zasobników wody w piwnicy i oświetlenie. W trakcie budowa instalacji parteru i poziomu piwnic.
31.	Świdnickie podziemia - trasa edukacyjne.	nie-zrealizowany	X	X	brak środków na realizację	X
32.	Remont z przebudową dla potrzeb informacyjno – oświatowych. Budowa sal konferencyjno-wykładowych. Budowa studia radia katolickiego.	w trakcie realizacji	2019-2020	680.000,00	środki własne	W trakcie przebudowa pomieszczeń parteru. Wyburzenie ścian, wykonanie przebić, wymiana podłoża pod posadzki. Prace konserwatorskie. Wzmocnienie konstrukcji z częściową przebudową. Wykonanie części posadzki kamiennej. Wykonanie części

						instalacji wod.-kan, co, teletechnicznej, elektrycznej.
33.	Remont z przebudową budynku kurii dla potrzeb integracyjnych w tym sal spotkań różnych grup wiekowych. Budowa kawiarenki jako miejsce kontaktów dla m.in. seniorów.	w trakcie realizacji	2019-2020	532.000,00	środki własne	Wykonanie części prac konserwatorskich sklepień w piwnicach. Wzmocnienie konstrukcji i fundamentów. Wykonanie WLZ, tablic i RG, instalacji gniazd i oświetlenia, teletechnika. Przebudowa podłoża pod posadzki- poziom piwnic.
34.	Remont z przebudową budynku kurii celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym budowa windy, podjazdów, podnośników, dostosowanie sanitariatów.	nie-zrealizowany	2019-2020 x	425.000,00	środki własne	Przebudowa związana z budową szybu windy. Budowa szybu windy, montaż i odbiór dźwigu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych. Przebudowa sanitariatów – demontaż instalacji, wykonanie przebić i wyburzeń. Częściowy montaż instalacji.
35.	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy.	w trakcie realizacji	2019 - 2020	2.465.841,44 w tym dofinansowanie 1.470.336,89	RPO WD 2014-2020 i środki własne	Projekt polega na modernizacji 52 systemów grzewczych obejmujących wymianę w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu wysokoemisyjnych źródeł ciepła (49 pieców kaflowych i 3 kotły węglowe). Źródła te zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej. Łącznie projekt obejmie 10 budynków wielorodzinnych w centralnej części miasta Świdnica. Wymiana 19 wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe będzie prowadzić do redukcji emisji CO2 powyżej 30% na danym kotle (redukcja min. 31%; redukcja max 64%). Podłączenie pozostałych 33 lokali mieszkalnych do sieci ciepłowniczej wraz z wymianą 19 kotłów doprowadzi do 100% redukcji emisji pyłów PM10 - 1,07 tony rocznie o i pyłów PM2.5 - 0,91 tony rocznie.

Na 35 projektów umieszczonych na liście B:

- **12** projektów zostało zrealizowanych z sukcesem,
- **8** projektów zostało zrealizowanych częściowo,
- **7** projektów jest w trakcie realizacji.

W przypadku **27** projektów z listy B wnioskodawcy zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji wykazali inicjatywę i przystąpili do realizacji zadań.

W przypadku **8** projektów z listy B wnioskodawcy zadań podejmowali działania – składali wnioski o środki zewnętrzne, bądź nie mieli możliwości finansowych pozwalających im na rozpoczęcie działań ze środków własnych. W większości były to zadania zgłaszane przez podmioty, które nie dysponowały wystarczającym budżetem własnym, a ich zadania uzależnione były od wsparcia zewnętrznego.

Podsumowanie:

W styczniu 2021 r. zostało skierowane zapytanie do podmiotów/osób realizujących projekty rewitalizacyjne dotyczące stopnia zaawansowania ich realizacji. Na podstawie przekazanych informacji opracowano **projekt** niniejszego **sprawozdania**, który zgodnie z zapisem Rozdziału 7: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji, Działu: Monitoring i ewaluacja, **Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024 (LPR)** z dniem 4 lutego 2021 r. został przesłany do członków Zespołu ds. Rewitalizacji celem zaopiniowania. W efekcie 21 członków Zespołu ds. Rewitalizacji zaopiniowało projekt rocznego sprawozdania monitoringowego pozytywnie bez zastrzeżeń.

sporz. b. starke/ 74 8562 965

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

Zastępca Prezydenta
Szymon Chojnowski

Dyrektor Wydziału
Anna Skrzypacz
